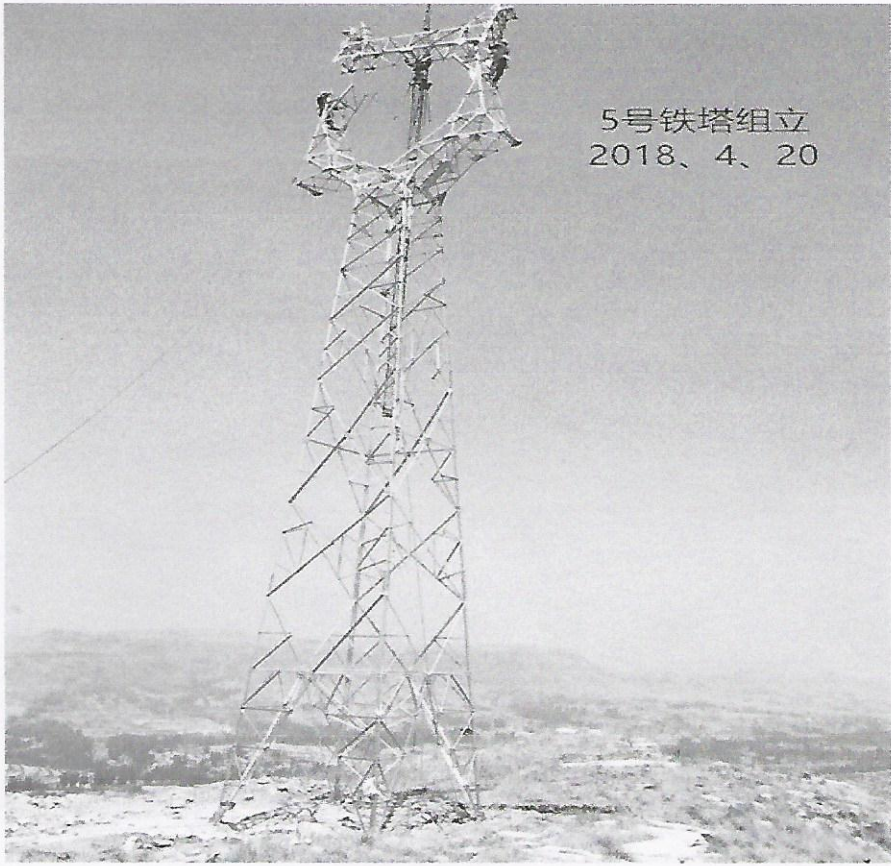


旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-

日期及天气：2018、4、20 多云 17~30℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 5 号铁塔组立	
旁站监理开始时间：上午 8 点 10 分	旁站监理结束时间：下午 18 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 8 人，一台简易升降机，一台发电机。监理人员重点检查了起重用的卷扬机、牵引绳、小绳、抱杆、滑轮以及安全围栏、警示牌等。同时，还重点检查了工地使用的运输车辆及高空作业人员的高处作业许可证，所有施工人员均佩戴安全帽，高空作业人员全部佩戴安全带。技术人员已进行了详细的技术交底。安装后塔身的垂直度，螺栓的紧固及防盗螺母的安装基本满足设计及规范要求。 5号铁塔组立 2018、4、20 	
发现的问题及处理情况： 个别螺栓没有加装防盗螺母，要求及时进行安装。	
旁站监理人员（签字）： 
