


旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-007

日期及天气：2018、3、 16 多云 -1~12℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 预制舱、接地变预制舱基础墙板浇筑	
旁站监理开始时间：上午 11 点 30 分	旁站监理结束时间：下午 15 点 40 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

预制舱基础墙板浇筑采用 C30 商砼，商砼运输时间 1 小时，采用泵车投送，插入式振动棒进行振捣，浇筑混凝土共 45m³,现场采用分层浇筑，分层振捣，浇筑前对基础配筋进行检查，对支模的尺寸及牢固性进行检查，对商砼的送料单进行确认，对商砼塌落度进行检测，对混凝土试块制作进行监督。

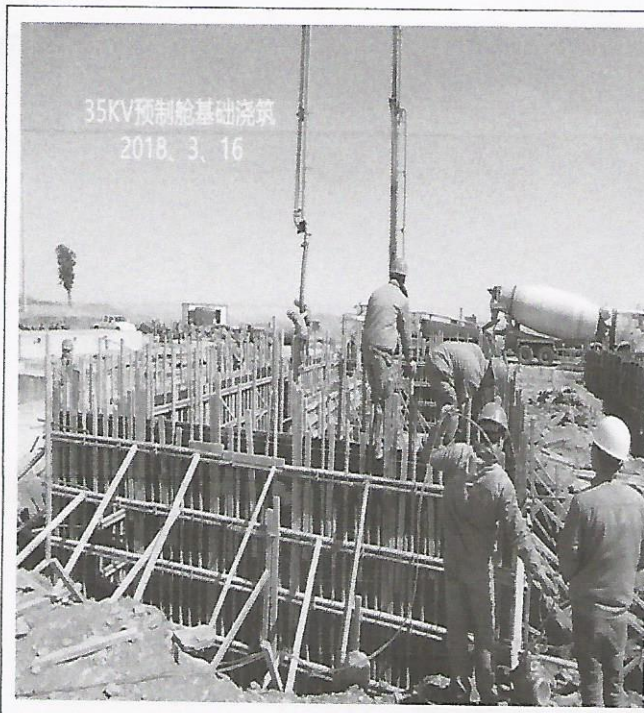

发现的问题及处理情况：

局部有轻微涨模现象，现场及时进行了修复加固。

旁站监理人员（签字）：

（Handwritten signature: 王悦水）

