


旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-009

日期及天气：2018、3、25	多云 12~20℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主变高压套管安装		
旁站监理开始时间：上午 8 点 10 分		旁站监理结束时间：上午 11 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 主变高压套管安装，在主变生产厂家技术人员的配合下，有四名施工人员进行安装，首先对高压套管进行了介损测试，技术指标满足设计规范要求，安装前对高压套管进行了认真清理，一台 25 吨吊车配合安装，整个安装过程安全平稳，没有造成高压套管的磕碰，连接螺栓进行对称紧固，保证所有螺栓全部紧固到位。		
 主变高压套管安装 2018、3、25		
发现的问题及处理情况： 安装过程符合规范要求。		
旁站监理人员（签字）： <u>戴小红</u>		

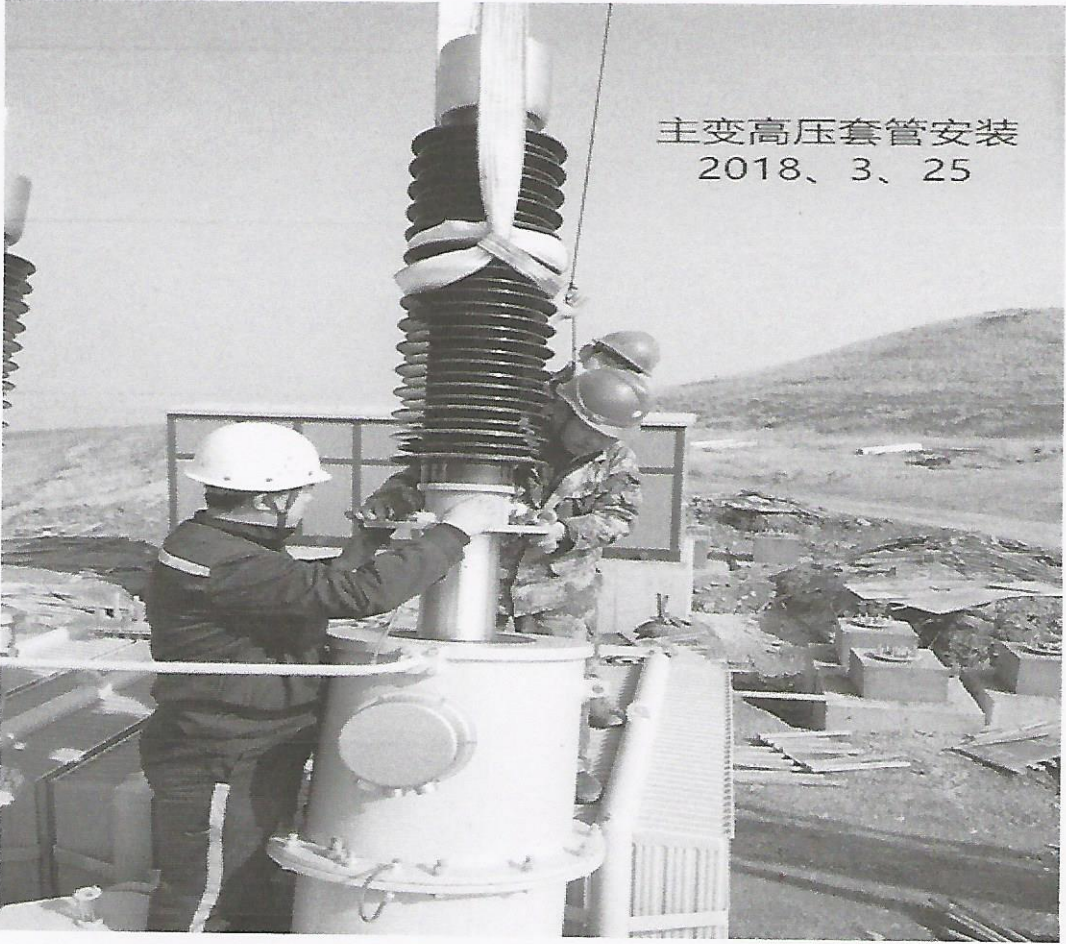
