

旁站监理记录表

工程名称: 山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-002

日期及气候: 2017 年 12 月 02 日

工程地点: 山东省滨州市阳信县经济开发区 301 号山东龙福环能科技股份有限公司内

旁站监理的部位或工序: 箱变基础混凝土浇筑


旁站监理开始时间: 2017.12.02 14: 00

旁站监理结束时间: 2017.12.02 16:30

施工情况:

准备: 1、中广核联达新能源工程有限公司现场负责人袁建新, 施工人员 8 人。

施工工艺: 基层处理→标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养。

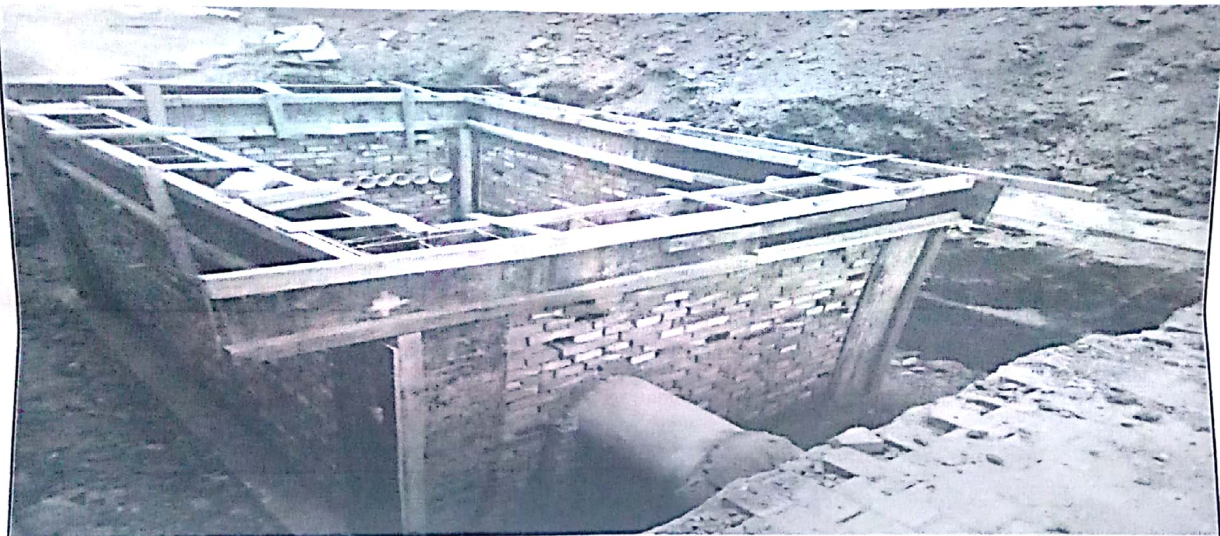

监理情况:

1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 无

施工项目部: 中广核联达新能源工程有限公司

监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员: 梁湘俊

旁站监理人员: 龙和军

日 期: 2017 年 12 月 02 日

日 期: 2017 年 12 月 02 日



由 扫描全能王 扫描创建
