

旁站监理记录表

工程名称：墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-001

日期及气候：2017 年 12 月 01 日

工程地点：山东省寿光市墨龙石油机械厂内

旁站监理的部位或工序：箱变基础垫层混凝土浇筑


旁站监理开始时间：2017.12.01 08:00

旁站监理结束时间：2017.12.01 12:10

施工情况：

准备：1、上海熠搜能源科技股份有限公司现场负责人路昆，施工人员 8 人。

施工工艺：基底处理→操平标高→弹水平控制线→自拌混凝土→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。

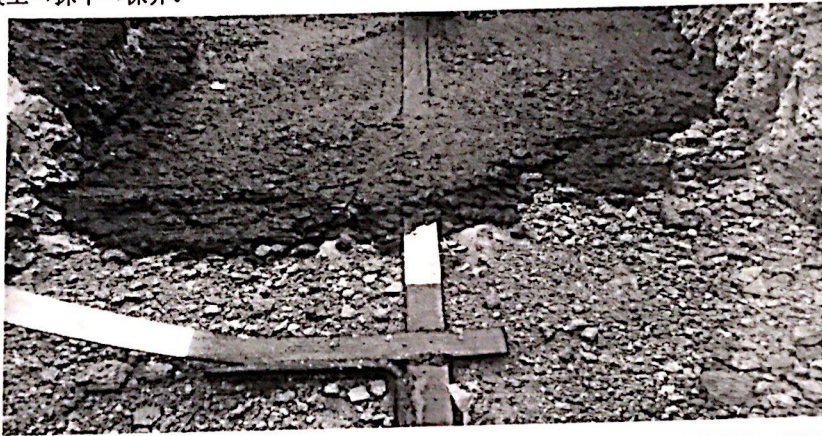

监理情况：

1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。

发现问题：垫层厚度未按照图纸要求施工

处理意见：增加垫层厚度

备 注：

施工项目部：上海熠搜能源科技股份有限公司

监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：路昆

司

日 期：2017 年 12 月 01 日

旁站监理人员：王福

日 期：2017 年 12 月 01 日
