

旁站监理记录表

工程名称：山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WC-PZJL-006

日期及气候：2018 年 1 月 15 日 多云

施工地点：山东潍坊潍柴动力（青州）传控技术有限公司

旁站的部位和工序：厂区花坛内电缆沟回填

旁站开始时间：2018.1.15 09:30

旁站结束时间：2018.1.15 11:00

施工和监理情况：

1、1 月 15 日电缆沟回填，将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3 名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2 名施工人员将砖满铺在软土上，然后将路边的细土进行回填。

2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。


3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。

4、铺设软土 10 公分符合规范要求。

5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

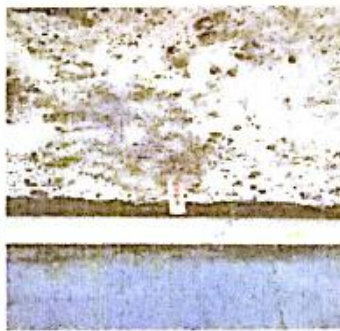

发现问题及处理情况：

无

施工单位：镇江新华电有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：周磊

旁站监理人员：刘瑞杰

日 期：2018 年 1 月 15 日

日 期：2018 年 1 月 15 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。
