

旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-006

日期：2017年12月30日 天气：阴

施工单位：羲和太阳能电力有限公司


旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁板柱基础承台

旁站开始时间：2017年12月30日9时10分

旁站结束时间：2017年12月30日16时10分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。
- 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用___振捣器，数量_1_台。
- 现场有混凝土工_6_人、钢筋工_1_人、模板工_1_人、安装人员_1_人，人员是☒否□符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。
- 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。
- 使用混凝土垫块是☒否□符合要求，垫层底板上或模板内是☒否□已清理干净。
- 钢筋及预埋预留的隐检是☒否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否□存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否□被踩变形。
- 混凝土从出厂到浇完是☐否□超过时限，混凝土运输车是☐否□在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。
- 混凝土标号_C30_，浇筑_43_m³，混凝土试块标养_1_组，同条件养护_1_组，抗渗试块_1_组，混凝土坍落度实测_2_次，分别为_177mm、175mm_是☒否□符合要求。
- 收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否□加水，是☐否□撒干水泥，模板是☐否□变形、跑模漏浆发生。

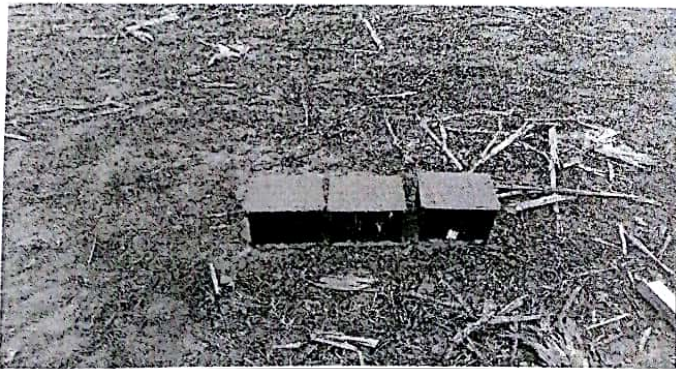

发现的问题及处理情况：

现场旁站发现，3#箱逆变基础混凝土振捣不到位，现场要求振捣到位，经要求现场施工及时整改。

1#箱逆变混凝土未抹平，现场要求抹平。

旁站监理人员（签字）：朱号兵

2017年12月30日
