

旁站监理记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: ZHJL-YHGS-PZ-010

日期: 2018 年 01 月 03 日 天气: 阴

施工单位: 羲和太阳能电力有限公司


旁站监理的部位或工序: 预制仓 SVG 基础梁柱混凝土浇筑

旁站开始时间: 2018 年 1 月 3 日 07 时 30 分

旁站结束时间: 2017 年 1 月 3 日 11 时 40 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用 电动 振捣器, 数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 8 人、钢筋工 1 人、模板工 2 人、安装人员 1 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求, 垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。
- 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字, 钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象, 钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。
- 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。
- 10、混凝土标号 C30, 浇筑 9 m³, 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组, 抗渗试块 1 组, 混凝土坍落度实测 2 次, 分别为 175mm、177mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。

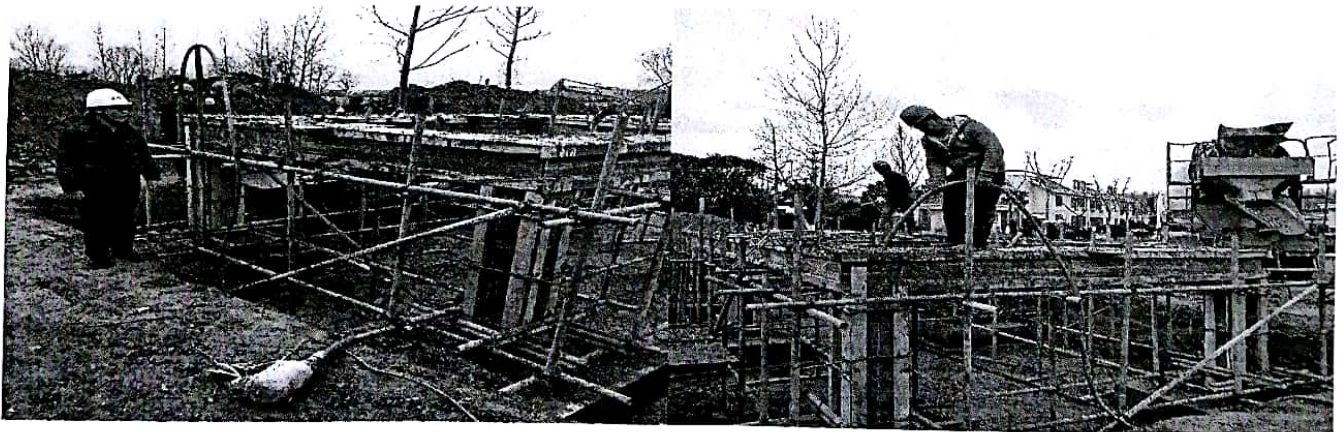

发现的问题及处理情况:

部分垫块脱落, 钢筋有贴模板现象, 现场要求增加垫块数量。

旁站监理人员(签字): 孔令才

2018 年 1 月 3 日
