

旁站监理记录表


工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-014

日期：2018年01月18日 天气：阴	施工单位：羲和太阳能电力有限公司
旁站监理的部位或工序：外线电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2018年01月18日13时20分	旁站结束时间：2018年01月18日15时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。
- 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。
- 3、施工工人共计6人，满足是☒否☐施工要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。
- 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。
- 6、回填土料来源基坑开挖，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度250mm，实测虚铺厚度24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是☐否☐符合要求。
- 7、每层夯压遍数3，抽查分层夯压遍数4；4；4；3；4(遍)符合要求5处；不符合要求0处。
- 8、本次回填高度1m。
- 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。

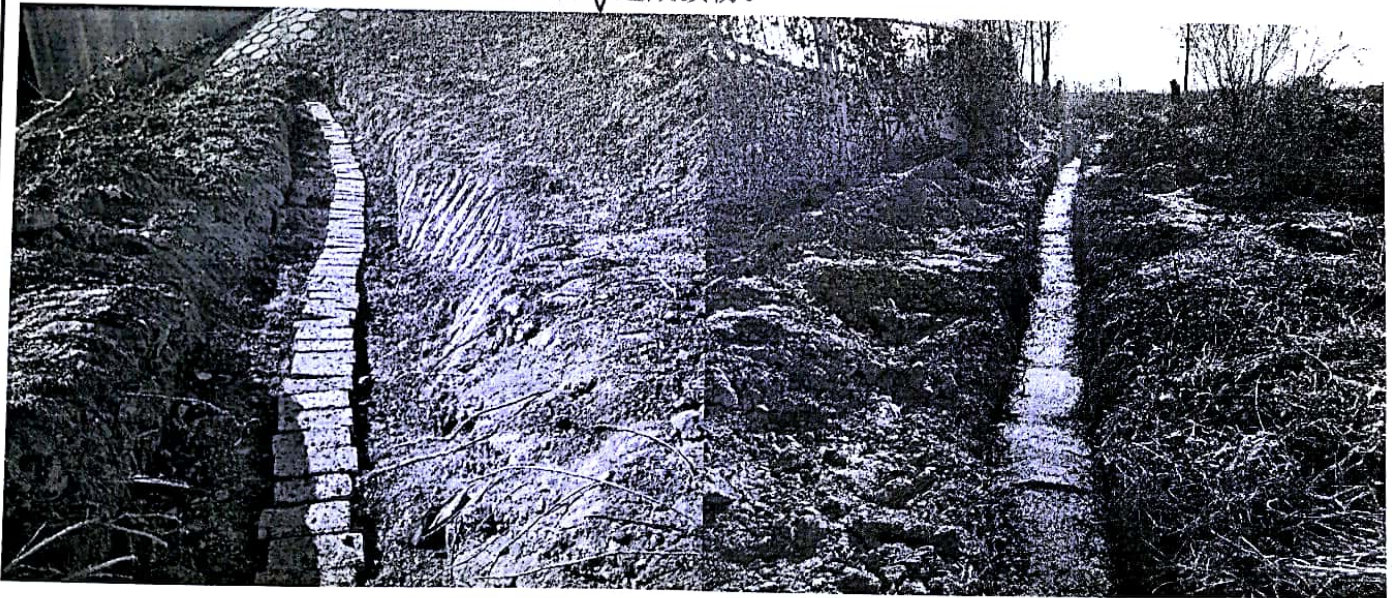

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员(签字)：孔令才

2018年1月18日
