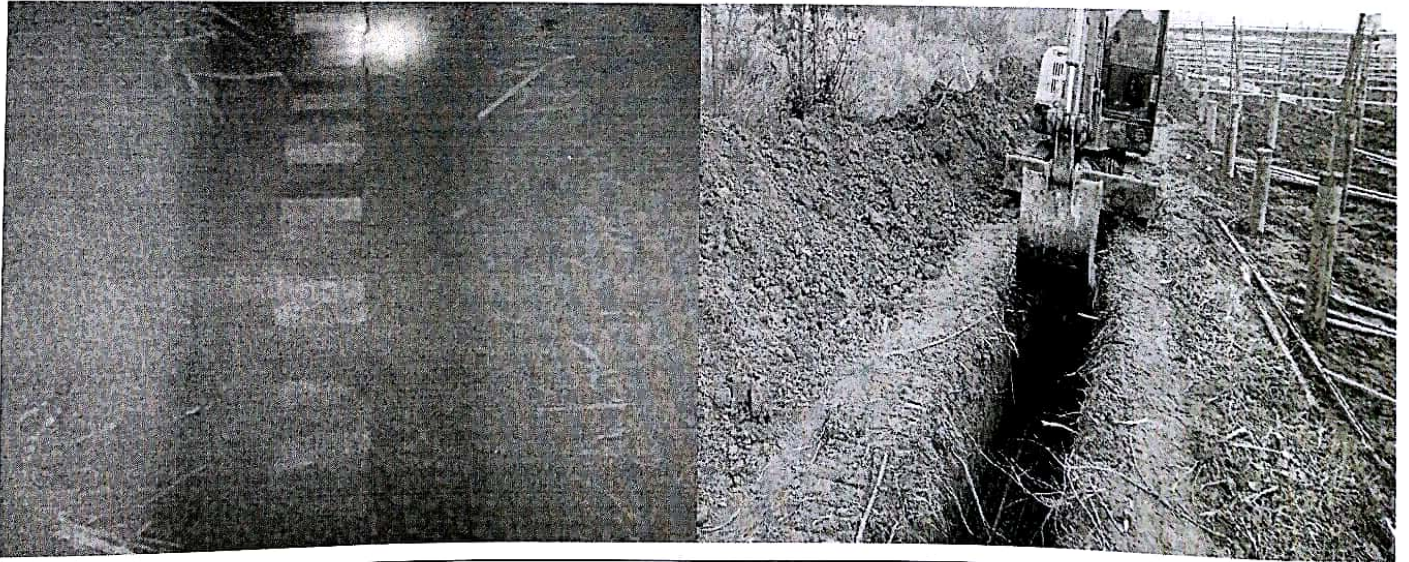


旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-017

日期： <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>20</u> 日 天气： <u>晴</u>	施工单位： <u>羲和太阳能电力有限公司</u>
旁站监理的部位或工序： <u>电缆沟 土方回填</u>	
旁站开始时间： <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>20</u> 日 <u>21</u> 时 <u>00</u> 分	旁站结束时间： <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>20</u> 日 <u>22</u> 时 <u>50</u> 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☐否☐已审批，是☐否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☐否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计<u>5</u>人，满足是☐否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☐否☐已清理干净。 6、回填土料来源<u>基坑开挖</u>，是☐否☐经监理认可；每层虚铺厚度<u>250</u> mm，实测虚铺厚度<u>24.3</u>、<u>24.6</u>、<u>25.3</u>、<u>25.1</u>、<u>25.5</u>、(cm)，是☐否☐符合要求。 7、每层夯压遍数<u>3</u>，抽查分层夯压遍数<u>4</u>；<u>4</u>；<u>4</u>；<u>3</u>；<u>4</u>（遍）符合要求<u>5</u>处；不符合要求<u>0</u>处。 8、本次回填高度<u>1</u> m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☐造成损伤。	
	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：<u>黄华洋</u> <u>2018</u>年<u>1</u>月<u>20</u>日	
