



旁站监理记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GF-PZJL-008

日期及气候： 2018.05.14 晴	施工单位：湖南力峰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1、2 号箱变设备基础浇筑	
旁站监理开始：2018 年 05 月 14 日 9:30	旁站监理结束：2018 年 05 月 14 日 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底； 2、监理人员检查垫层、钢筋绑扎的几何尺寸，均符合要求。 3、现场采用安仁众鑫混凝土有限公司的 C25 细石混凝土，商混站资质、混凝土厂家自检报告齐全、有效。 4、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均。当混凝土分层浇筑时，投料适中，振捣上一层混凝土时，土分层浇筑时，投料适中，振捣上一以消除两层之间的接缝，振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为 30-50s，以混凝土表面出现浮浆为止。旁站过程中没有漏浆、跑浆现象。 5、砼泵车 1 辆、浇筑施工人员 12 人、管理人员 3 人，燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、施工工器具数把；施工人员、设备满足浇筑要求。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  王健  王健 2018 年 5 月 15 日	

浇筑前对基础检查：

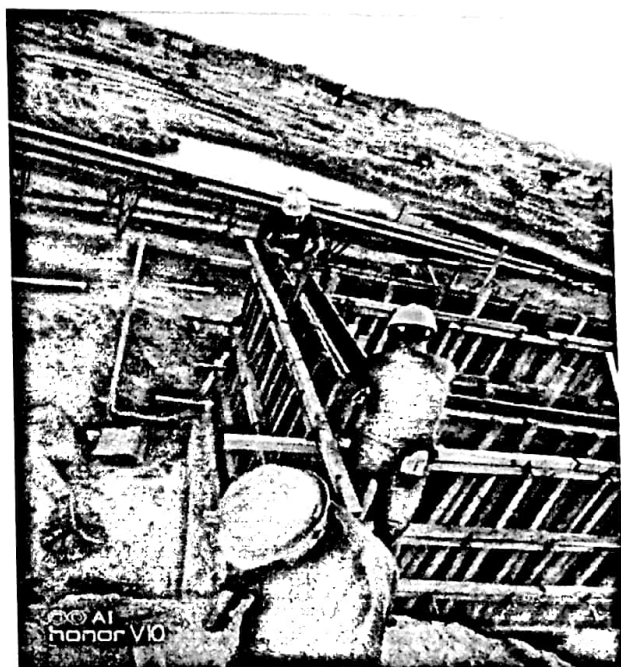

浇筑中：

