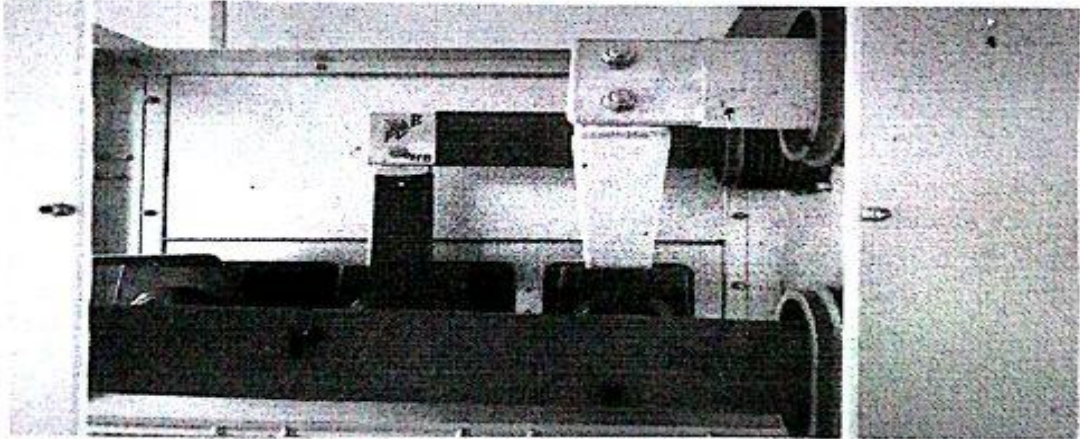


旁站监理记录表

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-PZ-001

日期及天气：2018 年 02 月 11 日	施工单位：晶科电力科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏接入柜拼接	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：14:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 上午 8:00 左右施工人员到达施工现场，先接好临时用电等施工前的准备工作。然后通知厂区电工停电，施工人员利用厂区叉车将接入柜运到配电间。 施工人员将接入柜就位后，首先将母线接地，接好后拆卸螺母并做了绝缘试验，然后用卷尺测量所要的铜排的长度，进行加工、连接。 连接好后进行了耐压试验。一切正常。 	
发现的问题及处理情况：	
无	
旁站监理人员（签字）：<i>段光林</i> 2018 年 2 月 11 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。
