

旁站监理记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 编号: ZHJL-ZJTS-045

日期及气候: 2019.10.7 多云

施工单位: 珠海兴业新能源科技有限公司



旁站监理的部位或工序: 电缆埋设

旁站监理开始时间: 14:00

旁站监理结束时间: 16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工技术交底, 然后开始工作。

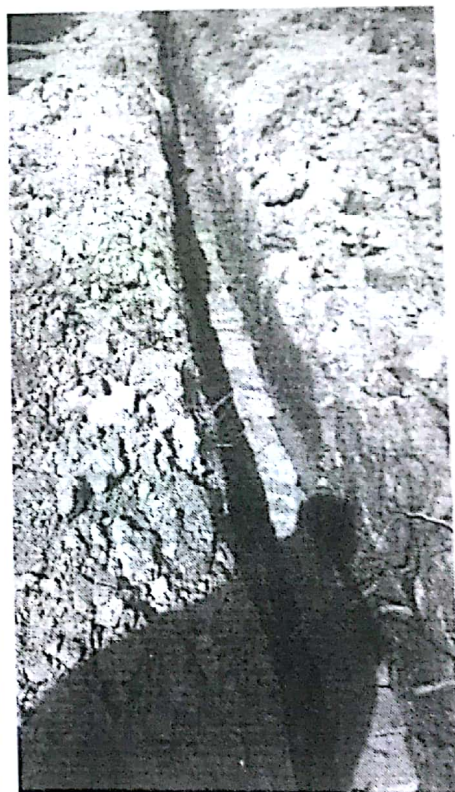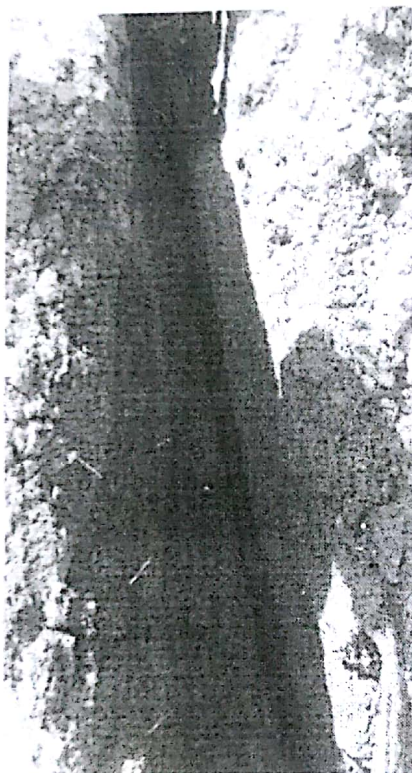

施工人员按照图纸设计和规范要求, 首先清除沟内杂物及石块, 以免损伤电缆。然后铺上细沙平整好, 盖好砖, 最后进行回填压实, 沟内无杂物。施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

葛文琦

2019 年 10 月 7 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
