

旁站监理记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 编号: ZHJL-ZJTS-046

日期及气候: 2019.10.8 阴

施工单位: 珠海兴业新能源科技有限公司


旁站监理的部位或工序: 高压电缆头制作

旁站监理开始时间: 14:30

旁站监理结束时间: 16:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

3×70mm² 35Kv 高压电缆施放到位, 施工作业人员到达现场, 工器具准备完毕。由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。

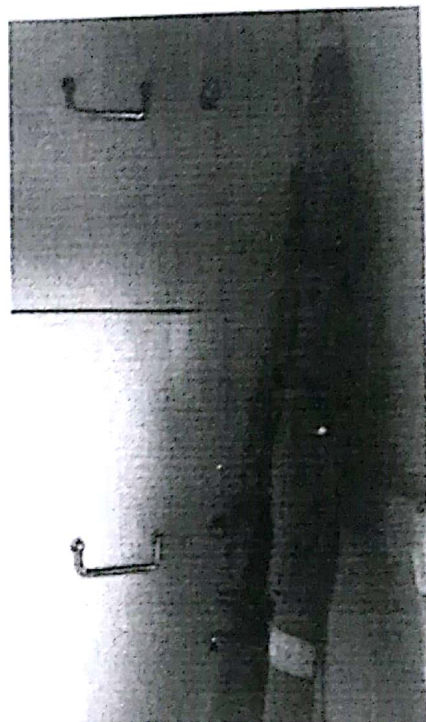

施工人员按照安装操作要求, 首先电缆头制作附件开箱, 检查附件是否齐全。然后按施工步骤进行工作。操作中, 注意钢铠层编织线与屏蔽层编织线勿短接, 切勿破坏绝缘层。要求电缆进行打压试验合格后才能与设备连接。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

葛文琦

2019 年 10 月 8 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
