

旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-012

日期及气候：2018.12.4 晴

施工单位：珠海兴业新能源科技有限公司


旁站监理的部位或工序：1号、2号、3号箱变基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间：8:30

旁站监理结束时间：10:00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25，共计 10m³。

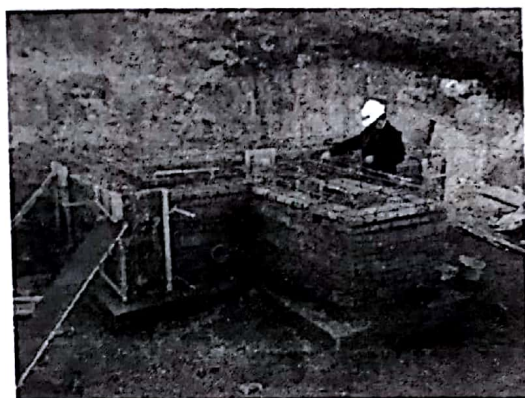

监理情况：

- 1、检查施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

部分施工人员未佩戴安全帽。

处理意见：

现场进行安全教育，并监督佩戴。

旁站监理人员（签字）： 

2018年12月4日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
