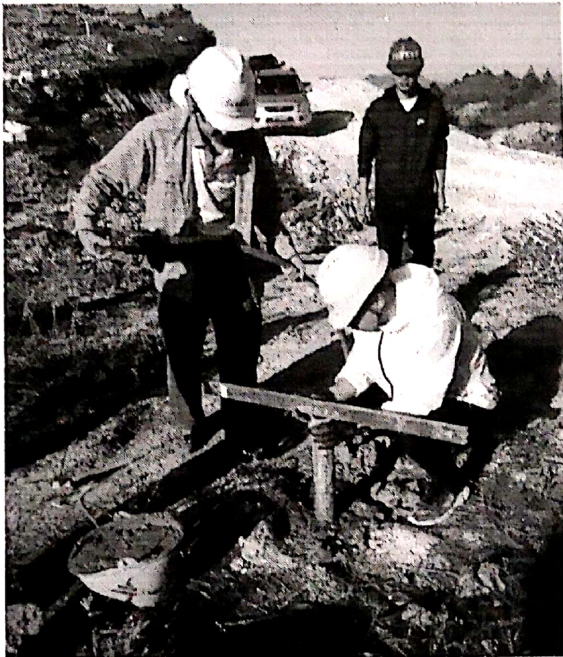



旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-028

日期及气候：2019.5.3 晴	施工单位：珠海兴业新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区六号地桩基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C30，共计 5m³。  	
发现问题： 个别部位振捣时间不足。 处理意见： 现场监督增加振捣时间，改进振捣工艺。	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 5 月 3 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
