

旁站监理记录表


工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-036

日期及气候: 2019.6.10 晴	施工单位: 珠海兴业新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区一号地 5#、7#、8#箱变基础基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 11:00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 10 人, 施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C30, 共计 13m³。

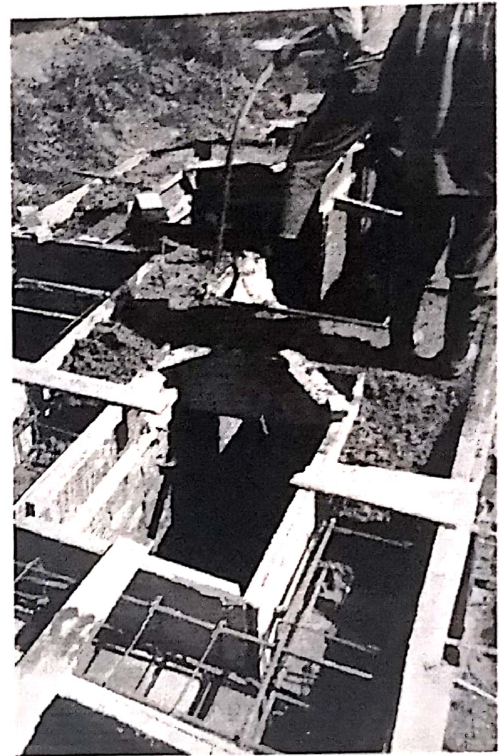


发现问题:

个别部位振捣时间不足。

处理意见:

现场监督增加振捣时间, 改进振捣工艺。

旁站监理人员 (签字): 

2019年6月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
