

旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 编号：ZHJL-ZJTS-037

日期及气候：2019.6.17 晴

施工单位：珠海兴业新能源科技有限公司


旁站监理的部位或工序：1#地高压电缆埋设

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工技术交底，然后开始工作。

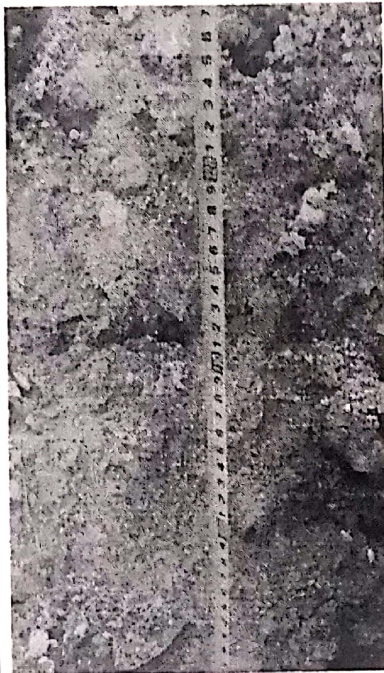

施工人员按照图纸设计和规范要求，首先清除沟内杂物及石块，以免损伤电缆。然后铺上细沙平整好，盖好砖，最后进行回填压实，沟内无杂物。施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

葛文琦

2019年6月17日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。
