

旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-044

日期及气候：2019.8.20 多云

施工单位：珠海兴业新能源科技有限公司


旁站监理的部位或工序：光伏区 6 号地接地网敷设焊接

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：10:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。

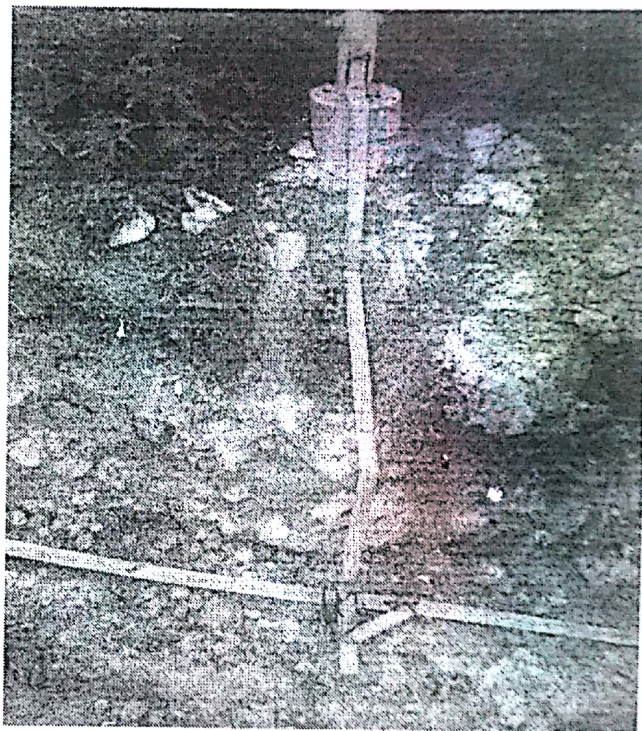

施工人员按照图纸设计要求，进行下料制作，然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的 2 倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固，符合设计要求。要求必须做好防腐工作后才能回填隐蔽。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

葛永琦

2019 年 8 月 20 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
