

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘潭县4×20兆瓦光伏发电扶贫项目

编号: 20181102019

日期及天气: 2018年11月2日 多云

施工单位: 湖南鸿源东方建设有限公司


旁站监理的部位或工序: 地圈梁基础浇筑

旁站监理开始时间: 8: 30

旁站监理结束时间: 10: 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员 7 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
2. 梁砼为商品混凝土 C30, 直泻浇筑;
3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
4. 混凝土浇筑过程符合设计要求;
5. 施工工具: 插入式震动棒 1 根;
6. 设计塌落度: $120 \pm 30\text{mm}$ 。

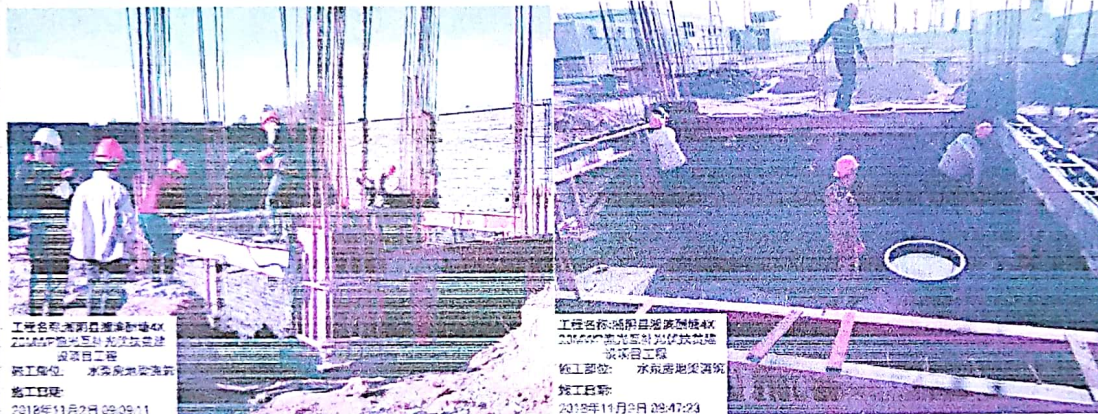

发现的问题及处理情况:

- 1、基础浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30;
- 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;
- 3、c30 现场检查塌落度实测值为 140mm;
- 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆;
- 5、钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求;
- 6、浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;

旁站监理人员(签字):

(Handwritten signature)

2018 年 11 月 02 日



由 扫描全能王 扫描创建
