
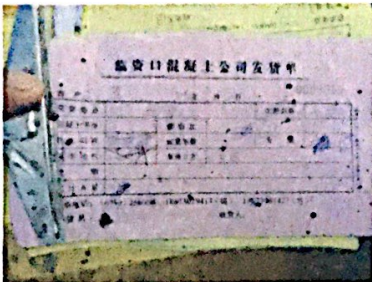


旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

编号：20180528008

日期及天气：2018 年 5 月 28 日 晴	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主变基础及主变构架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：14:25	旁站监理结束时间：20: 45
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查基础厚度、平整度； 2.检查基础的淤泥、积水情况； 3.检查钢筋大小符合图纸要求，检测报告； 4.检查模板的加固，承载力等问题；检查混凝土配合比符合 C25 的要求； 5.施工现场两台插入式震动棒作业；  	
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑时所使用的振动棒不能满足施工要求，导致振捣不到位。 设计要求混凝土强度为 C25，现场混凝土实际强度为 C35 满足要求允许浇筑。	
旁站监理人员（签字）： 	2018 年 5 月 28 日

