


旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

编号: 20180616013

日期及天气: 2018 年 6 月 16 日	多云	施工单位: 湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站事故油池基础砼浇筑		
旁站监理开始时间: 10:15		旁站监理结束时间: 15: 45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1.检查基础厚度、平整度; 2.检查基础的淤泥、积水情况; 3.检查钢筋大小符合图纸要求, 检测报告; 4.检查模板的加固, 承载力等问题; 检查混凝土配合比符合 C30 的要求; 5.施工现场两台插入式震动棒作业; 6.检查商混方量是否满足设计要求; 7.检查现场是否留置标养试块和同条件养护试块。		
 		
发现的问题及处理情况: 基础浇筑前检查模板支撑牢固, 钢筋规格及配筋符合设计要求, 使用已初商品混凝土, 满足设计要求, 浇筑时两台震动棒作业, 需留置试块。 现场已留置标养试块, 但未留置同条件养护试块, 已通知施工单位必须留置同条件养护试块, 否则对工程质量验收不予签字。		
旁站监理人员 (签字): 王友军		2018 年 6 月 16 日

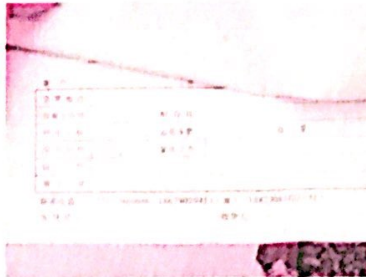
