

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20181123020

日期及气候：2018.11.23 晴 7℃-17℃

施工地点：综合楼

旁站监理的部位或工序：综合楼基础打桩

旁站监理开始时间：2018.11.23 15:06

旁站监理结束时间：2018.11.23 17:30

施工情况：

1. 施工人员 5 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
2. 施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕
3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。
5. 因施工现场的特殊性，桩基施工中严格控制锤击力度，多锤浅近，控制送桩深度，避免震动过大造成站区内运行设备无动作，开关闸脱落问题；施工前和运行单位沟通好设备区的检查工作。对周围已建的建筑物做好沉降观测记录；水泵房、围墙距离施工范围最近，避免震动多大造成结构质量问题；施工中安排技术人员随时检查。

监理情况：

1. 已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。
2. 桩基施工中严格控制锤击力度，多锤浅近，控制送桩深度，避免震动过大造成站区内运行设备无动作，开关闸脱落问题；
3. 施工前和运行单位沟通好、已对设备区进行检查。
4. 已对周围已建的建筑物做好沉降观测记录；
5. 配电楼、水泵房、围墙距离施工范围最近，避免了震动大、未对造成结构质量问题；
6. 施工中已安排技术人员随时检查。

发现问题：

无

处理意见：

无


旁站监理人员：董长清

2018 年 11 月 23 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

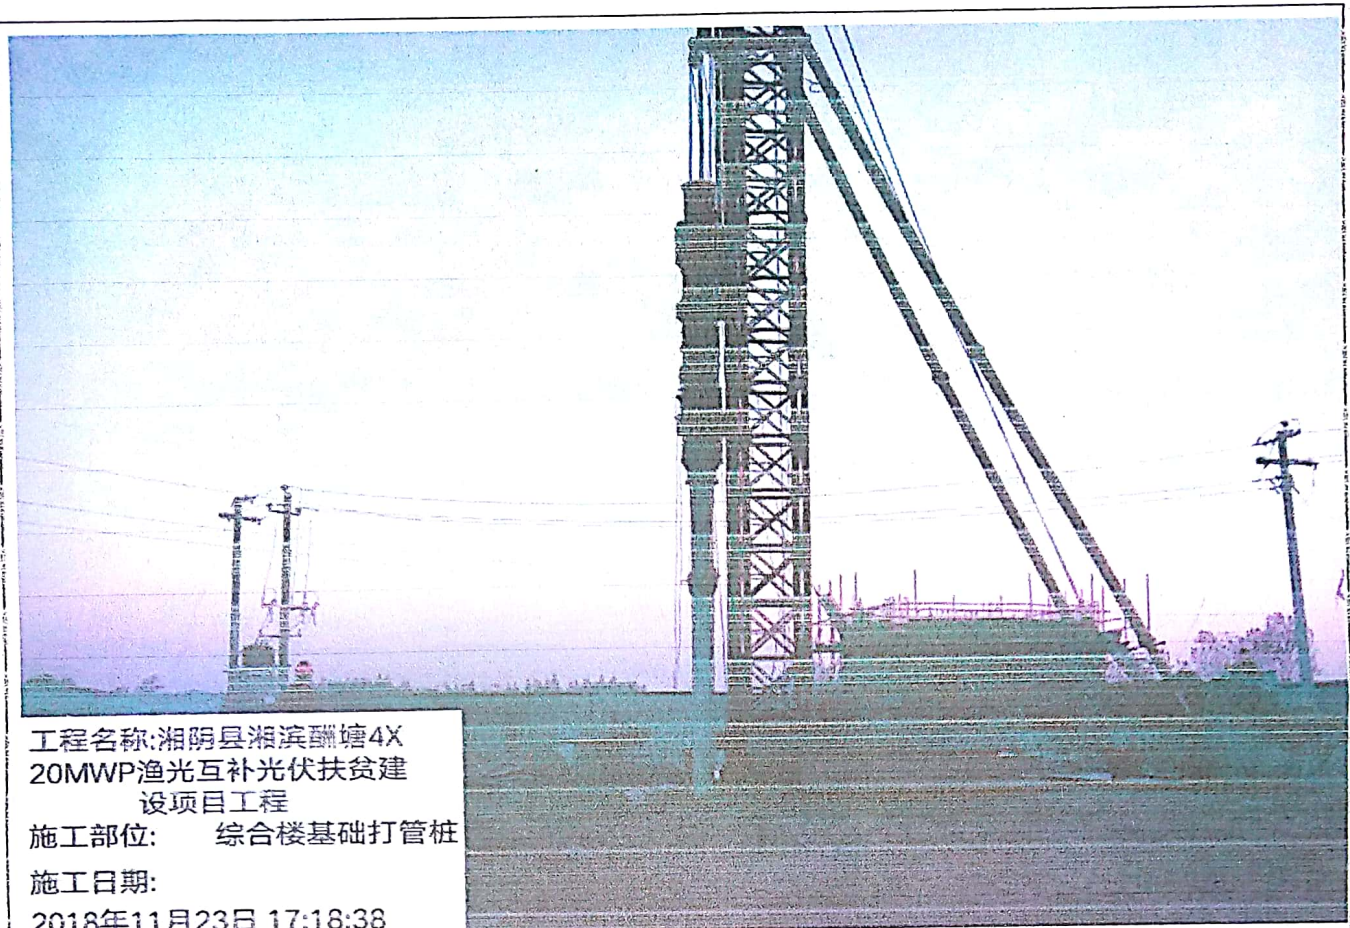

工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程
施工部位: 综合楼基础打管桩
施工日期:
2018年11月23日 17:18:38



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程
施工部位: 综合楼基础打管桩
施工日期:
2018年11月23日 15:06:40

