

极速图片转 PDF 工具

未注册版

一次注册， 终身使用

（注册后将不再有此页出现）

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目 编号：ML-TJ--



日期及气候：2018. 4. 30 阴 施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司

旁站监理的部位或工序：综合配电楼条形基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间：14:30 旁站监理结束时间：20:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

砼浇筑前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。

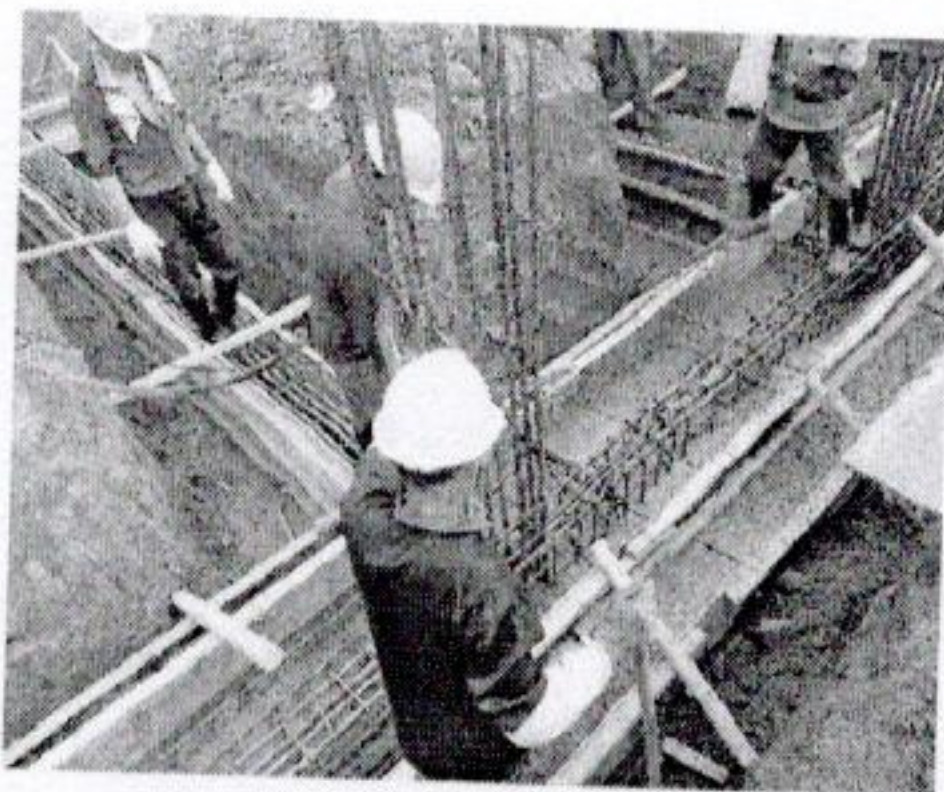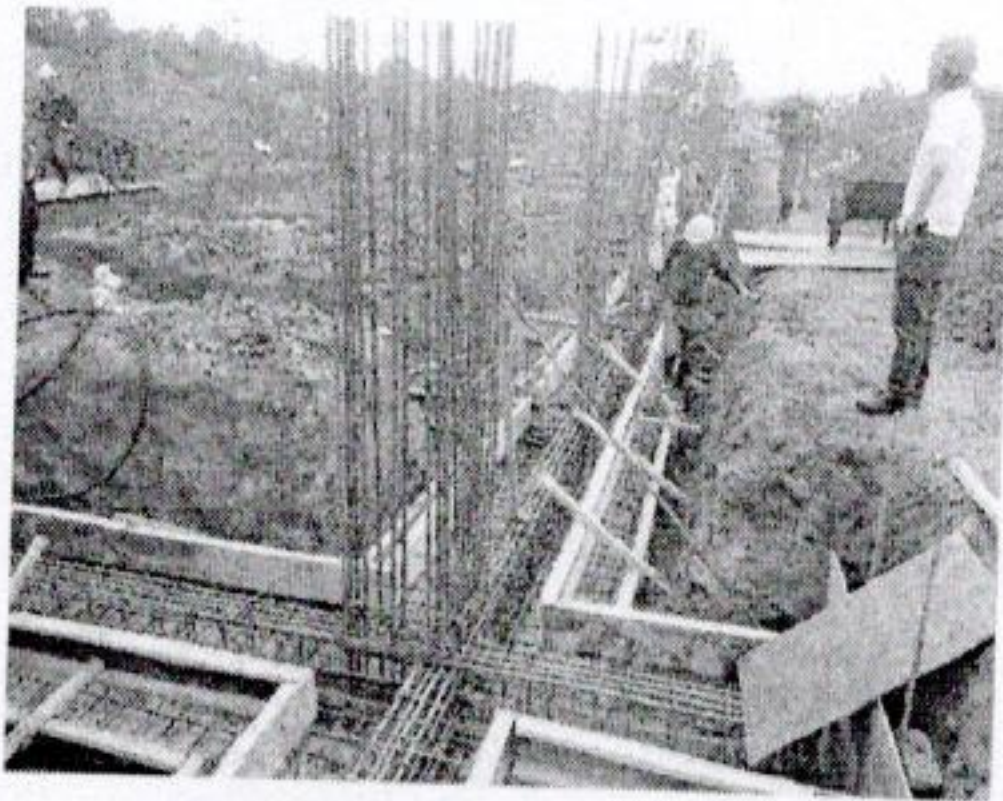

监理情况：

基础钢筋绑扎完成、模板支设完成，验收均符合要求。检查商砼出厂证明、合格证，要求现场制作试块，标准养护试件作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。连续震动时间约为 25s-40s，以混凝土表面出现浮浆为止。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。

2 发现的问题及处理情况：

浇筑前基础必须清理干净方可浇筑。

旁站监理人员（签字）：

周书山

2018 年 4 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
