

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ--040

日期及气候：2018.9.18

晴

施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司

旁站监理的部位或工序：办公楼屋面防水施工

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：11:00


旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工单位施工人员 3 人，施工员、安全员就位。

2、施工设备：液化气瓶、喷枪、钢卷尺等。

3、主要材料：聚氨脂防水涂料、WIPS 高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材等。

首先由施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底，喷枪等工器具准备完毕，然后开始工作。

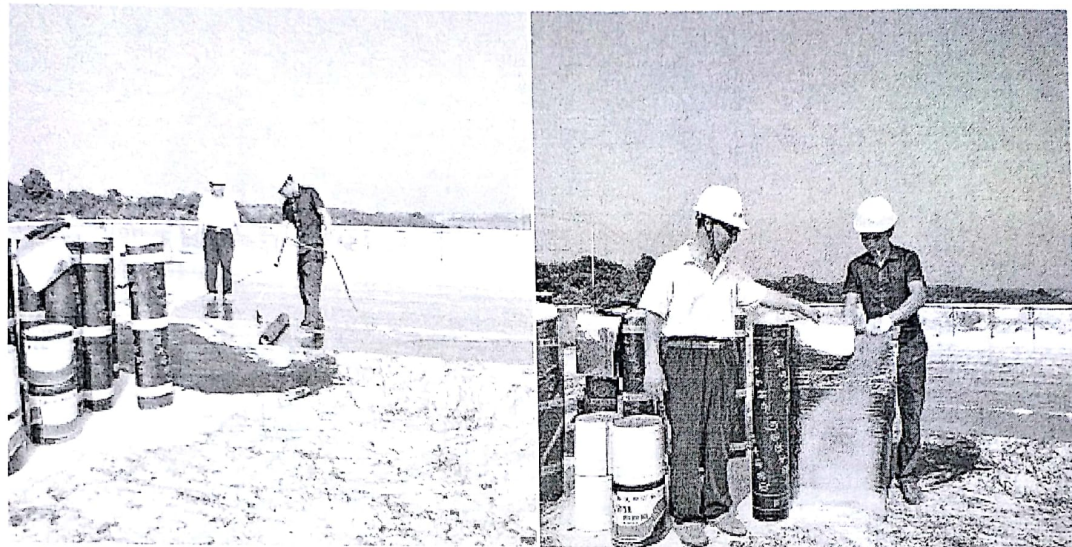

监理情况：

施工人员按照图纸要求，首先对屋面进行清洁处理，然后涂刷聚氨脂防水涂料两道，选用 WIPS 高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材进行下料，进行喷烤安装，安装过程中保证规定的搭接、压接长度，喷烤准确到位，制作过程符合设计和规范要求。

发现问题及处理情况

个别处搭接长度不到位，要求立即整改。整改完毕后经复查，合格。

旁站监理人员（签字）：孔令才

2018年9月18日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。
