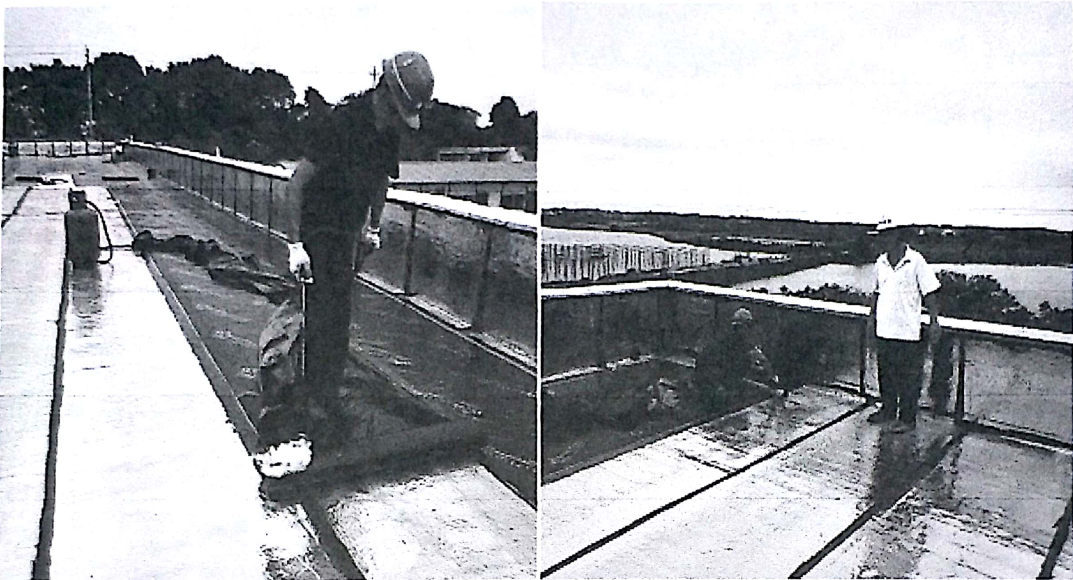


旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ-044

日期及气候：2018.10.14 多云	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：办公楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 2 人，施工员、安全员就位。 2、施工设备：液化气瓶、喷枪、钢卷尺等。 3、主要材料：聚氨脂防水涂料、WIPS 高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材等。 首先由施工单位项目部安全、技术人员对现场施工人员进行了安全和技术交底，喷枪等工器具准备完毕，然后开始工作。	
	
监理情况： 施工人员按照图纸要求，首先对第一层防水卷材表面进行清洁处理，然后涂刷聚氨脂防水涂料两道，选用 WIPS 高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材进行下料，进行喷烤安装，安装过程中保证规定的搭接、压接长度，喷烤准确到位，制作过程符合设计和规范要求。	
发现问题及处理情况 个别处压接宽度不到够，要求立即整改。整改完毕后经复查，合格。	
旁站监理人员（签字）： 孔令才 2018 年 10 月 14 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
