

旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-TJ-- 049

日期及气候: 2018.12.24 阴

施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司


旁站监理的部位或工序: 开关站污水处理池混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 9:00

旁站监理结束时间: 12:00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 10 人, 施工人员、施工员、安全员和施工机具就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土, 等级为 C30, 共计 20m³。

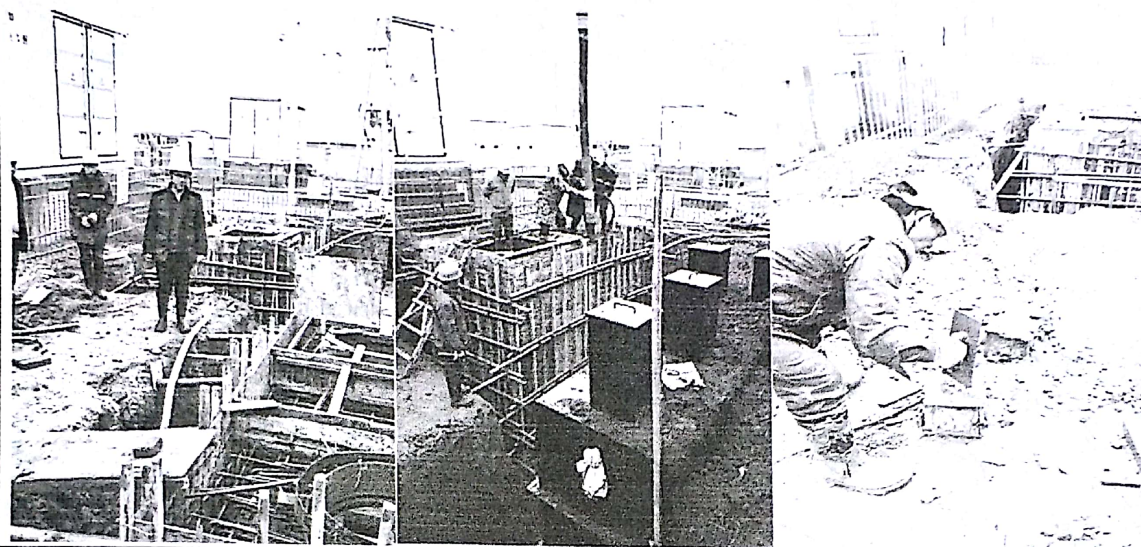

监理情况:

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。

发现问题及处理意见:

- 1、混凝土浇筑时, 发现个别处振捣不及时。已要求施工单位增加振捣设备和振捣人员, 及时振捣, 经复查振捣及时合格。

旁站监理人员(签字):

(Handwritten signature)

2018年12月24日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
