

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ-050

日期及气候：2018.12.25

阴

施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司


旁站监理的部位或工序：开关站雨水管道预埋安装

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员 10 人，施工机具（挖掘机）一台、施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部安全、技术人员对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、雨水管道为 400 的混凝土预制管，共计 40m。

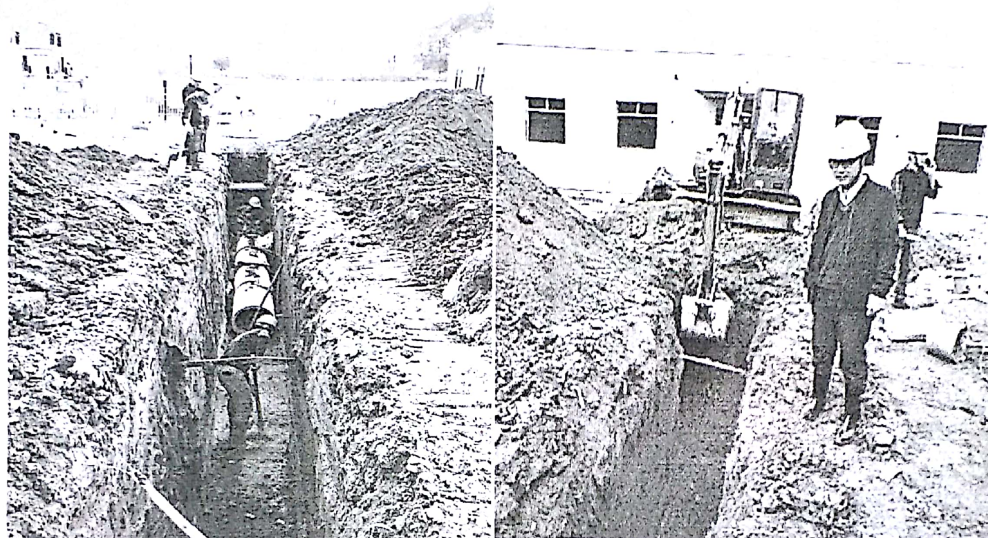

监理情况：

- 1、检查雨水管道沟的深度和宽度等施工情况和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查雨水管道敷设施工情况。
- 3、现场旁站雨水管道敷设施工过程，检查施工过程是否规范。

发现问题及处理情况：

雨水管道敷设施工时，管道个别搭接处混凝土较少，已令整改。已增加了混凝土厚度，经检查，达到了标准要求。

旁站监理人员（签字）

孔金才

2018 年 12 月 25 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。
