

# 旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ-- 075

日期及气候：2019.03.12 晴 9~22℃

施工单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司


旁站监理的部位或工序：南琴线 9#、32#塔基浇筑混凝土

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：16:20

施工的关键部位、关键工序施工情况：

砼浇筑前，施工人员、机具、C30 的预拌砼已准备到位。由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，施工人员 20 人、施工员、安全员就位，预拌砼用量预计共 24 立方，然后开始施工。

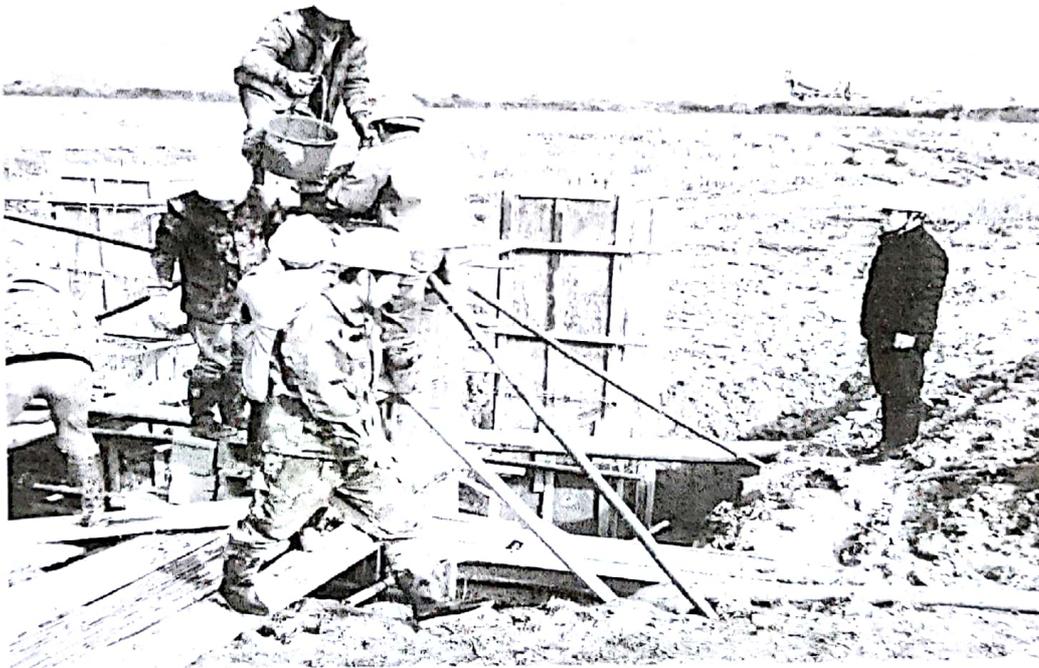

监理情况：

监理人员检查钢筋绑扎及模板安装情况，检查商砼出厂证明、合格证情况，均符合要求。A、B、C、D 四个腿一次性浇筑完成。要求现场制作试块，标准养护试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀，连续振捣时间约为 25S-40S，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。

发现问题及处理意见：

基础浇筑时，个别处振捣不均匀，已令整改，经复查，达到合格要求。

旁站监理人员（签字）：王英光

2019 年 3 月 12 日
