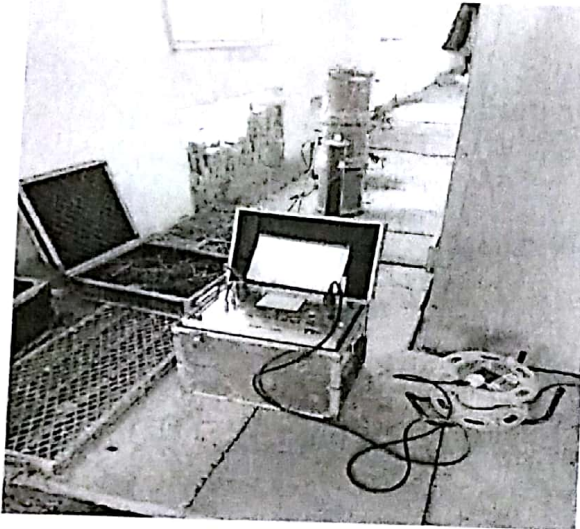
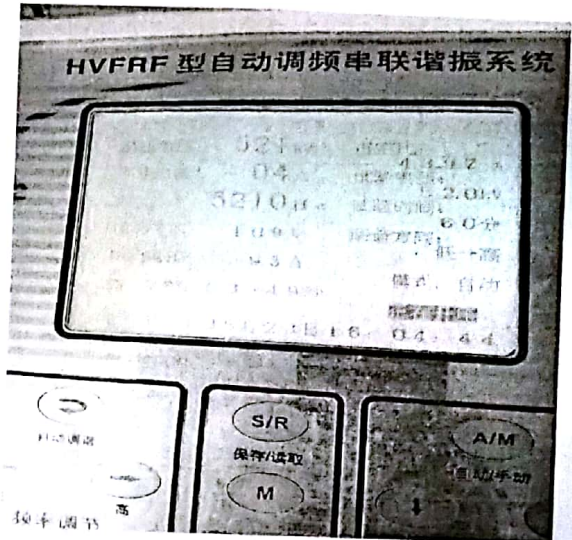


旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目		编号: ML-DQ-
日期及气候: 2018. 6. 23 多云	施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司	
旁站监理的部位或工序: SVG、接地变、出线高压电缆试验		
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 测试人员到达现场, 试验仪器设备、工器具准备完毕。由现场负责人作安全操作、试验工作交底, 然后开始工作。		
		
监理情况: 试验操作人员按照规范要求, 无关人员离开现场, 安装摆放好试验仪器(HVFRF 型自动调频串联谐振系统、HVFRF 串联谐振装置-励磁变压器、HVFRF 串联谐振装置-高压电抗器、HVFRF 串联谐振装置-电容分压器等)。然后进行试验工作。整个试验过程符合规范要求。		
发现的问题及处理情况: 1#接地变电缆、2#SVG 电缆出现击穿现象。 要求找出击穿点或者更换电缆, 电缆头重做, 重新打压试验, 直到合格为止。		
旁站监理人员(签字): 葛庆琦		2018 年 6 月 23 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
