

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML--TJ--

日期及气候：2018 年 6 月 17 日 多云 24-35℃

施工地点：光伏区


旁站监理的部位和工序：26 区 箱逆变基础平台就位安装

旁站监理开始时间：15: 00

旁站监理结束时间：19: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、现场焊接检查符合要求，平台重 7T，使用 25T 吊车，船只运输能力未 20T。吊装设备进场验收符合要求。

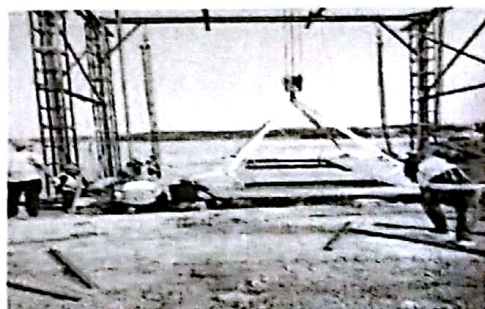

监理情况：

- 1、检查平台焊接质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查所使用哪个吊具符合规范要求，就位焊接依照施工单位编制的作业指导书。
- 3、现场旁站吊装过程，施工工艺。

发现问题：

- 1、吊车打钩无防脱保险。

处理意见：


- 1、要求立即安装，同时要求施工单位加强进场大型设备验收工作。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。全程安全完成就位。

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：



日期：2018 年 06 月 17 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
