

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML--TJ--

日期及气候：2018 年 6 月 10 日 多云 24-31℃

施工地点：开关站


旁站监理的部位和工序：综合办公楼构造柱、雨棚、地坪混凝土浇筑

旁站监理开始时间：9: 00

旁站监理结束时间：12: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C30，共计 15m³ 用于构造柱、雨棚，地坪 C15，计 20m³。

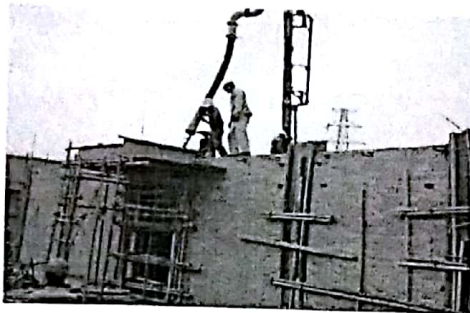

监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 1、构造柱浇注时，混凝土振捣不及时。

处理意见：

- 1、现场要求加强混凝土振捣，增加振捣人员。已增加一名振捣人员

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成，工艺符合要求。

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：[Signature]

日期：2018 年 6 月 10 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
