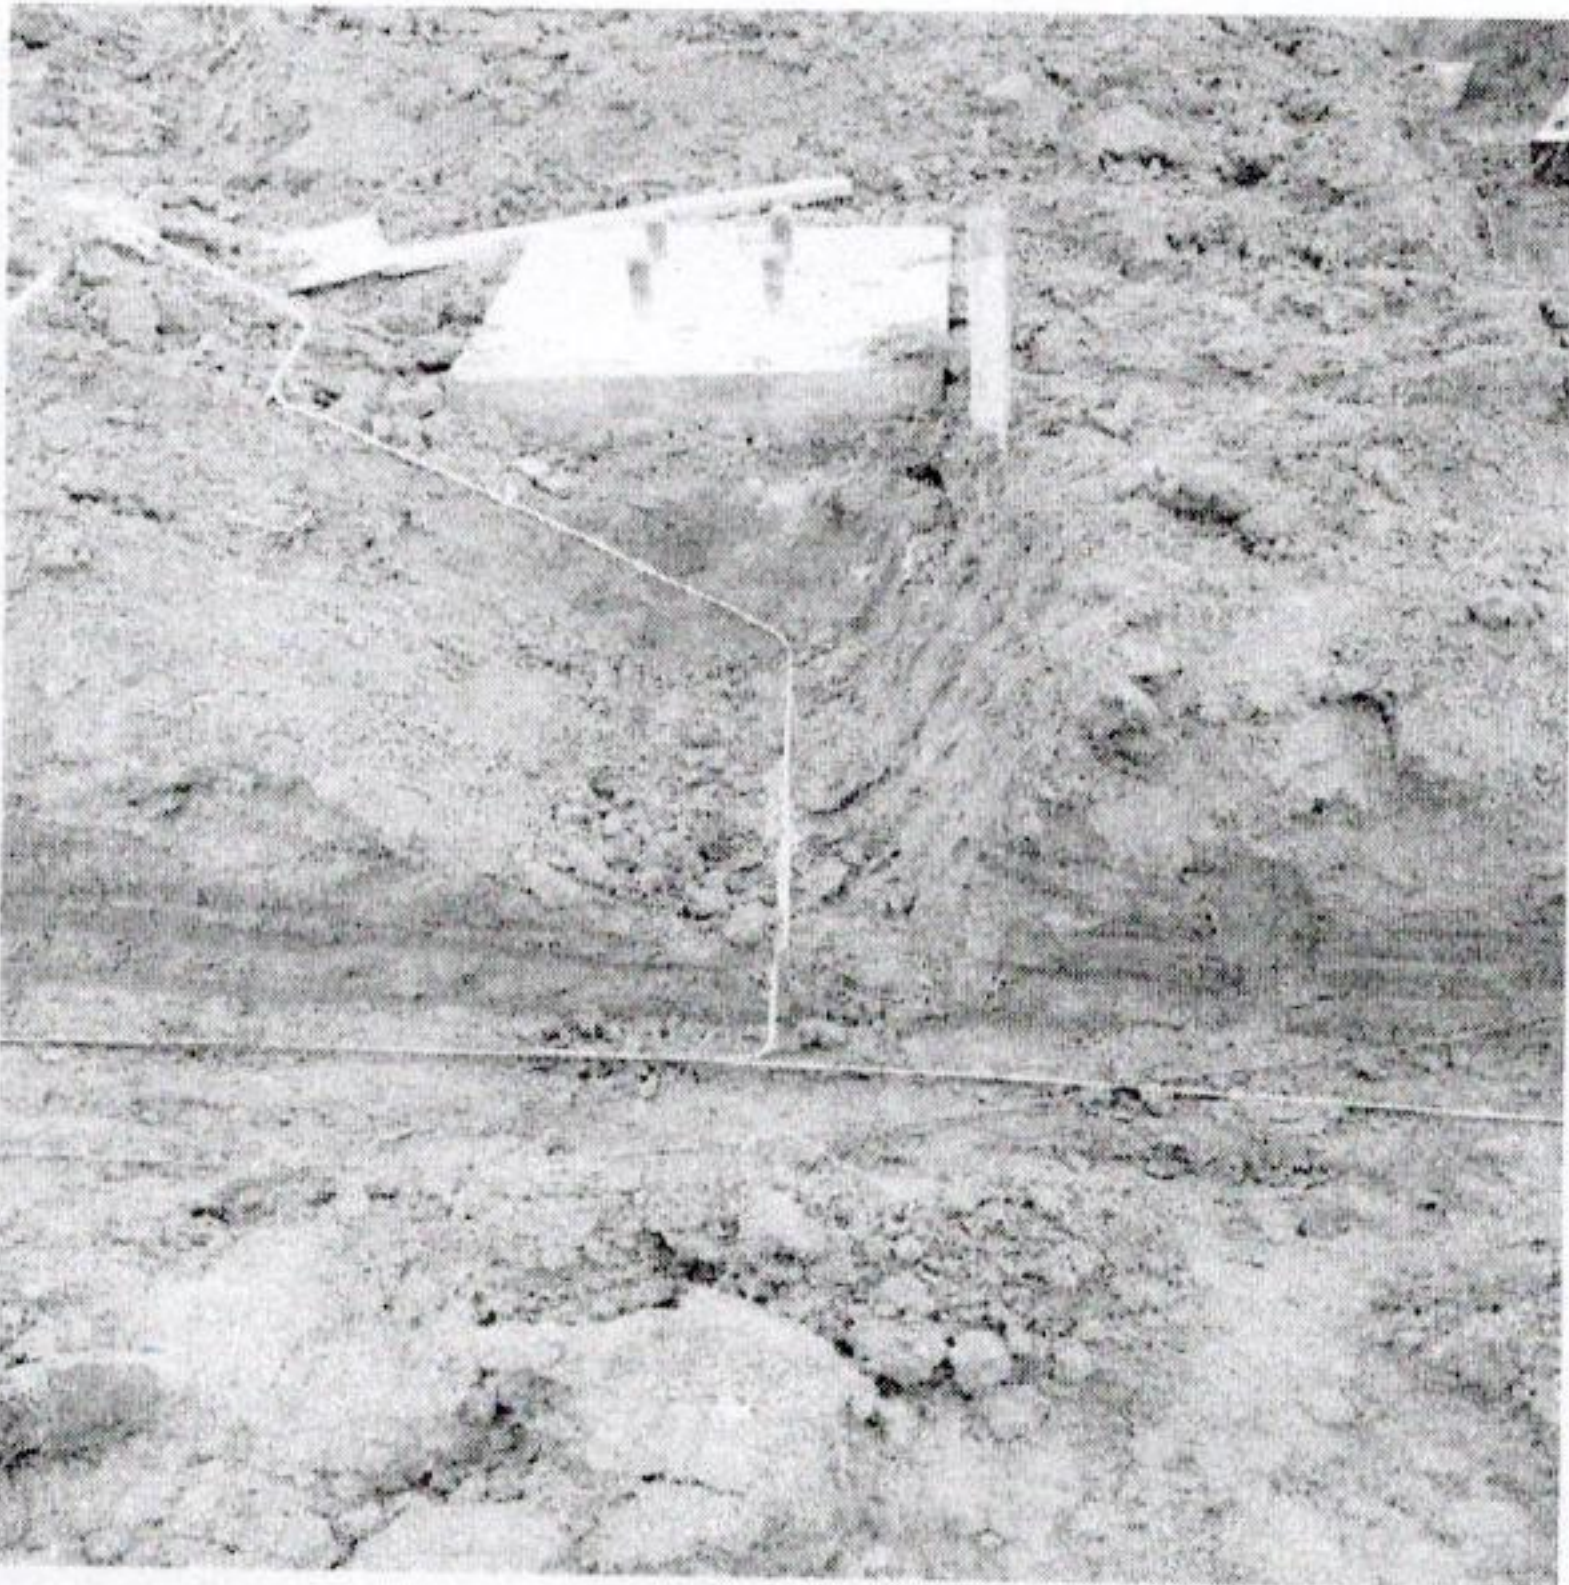
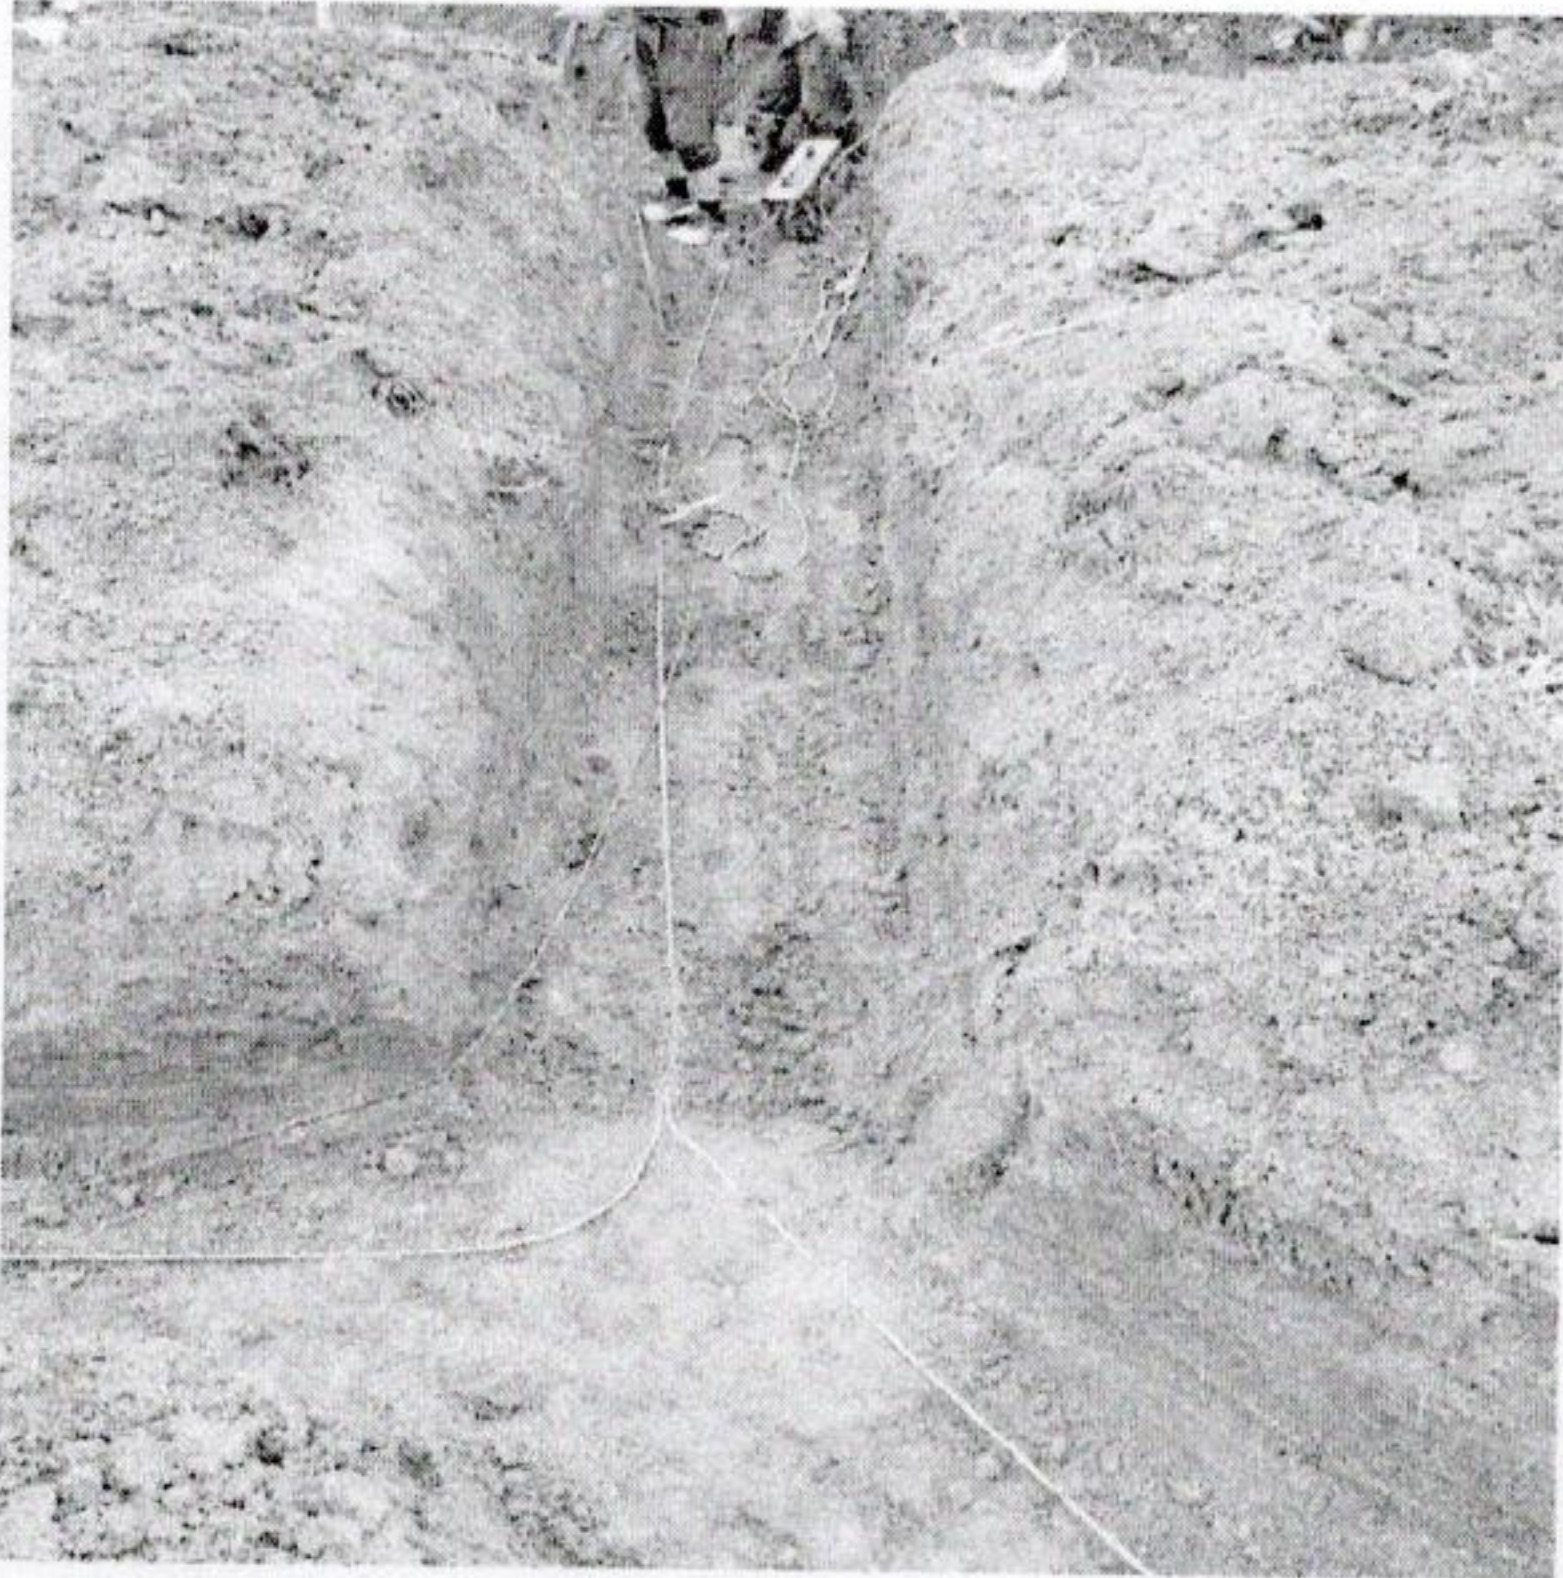



旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-DQ-

日期及气候：2018.5.6 阵雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：1# 外线塔接地装置安装	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。  监理情况： 施工人员按照图纸要求进行下料，然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于圆钢直径的 6 倍，焊缝平整、饱满、牢固。接地网埋设深度、连接方式和焊接均符合要求。焊接完成后做好防腐工作。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）： 2018 年 5 月 6 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。
