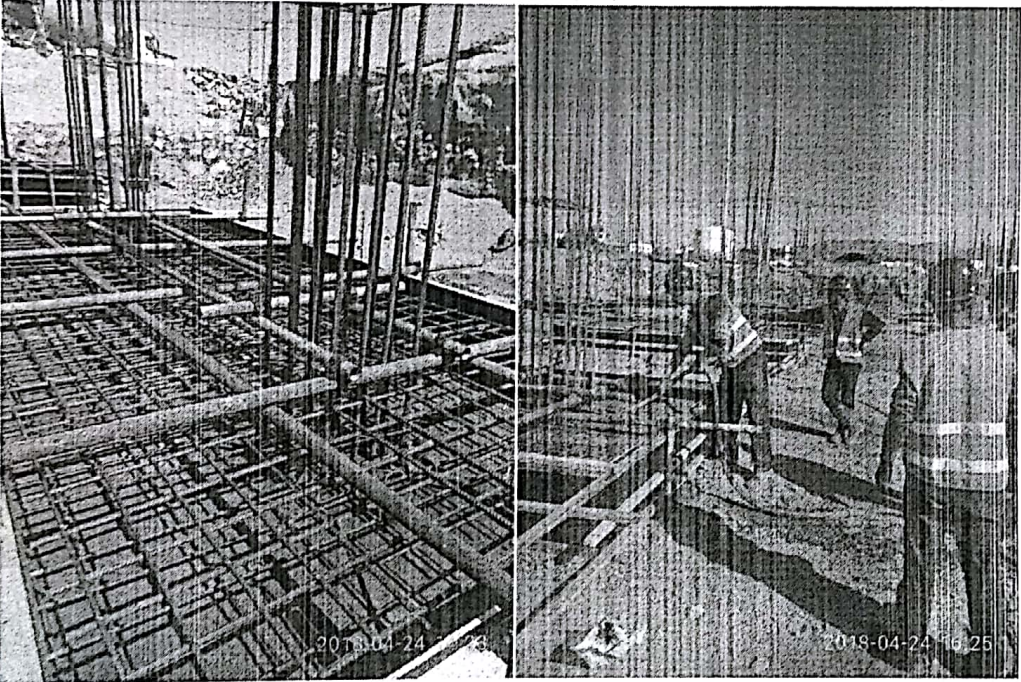


旁站监理记录表

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号：WH-PZJL-002

日期及天气：2018 年 4 月 24 日 晴 7-22℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房柱基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：15: 30	旁站监理结束时间：18: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 1 台，发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，81m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：钢筋绑扎间距不均匀、施工人员安全帽佩戴不规范。 处理情况：钢筋间距进行调整，安全帽现场已整改。	
旁站监理人员（签字）： <u>张子强</u> 2018 年 4 月 24 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
