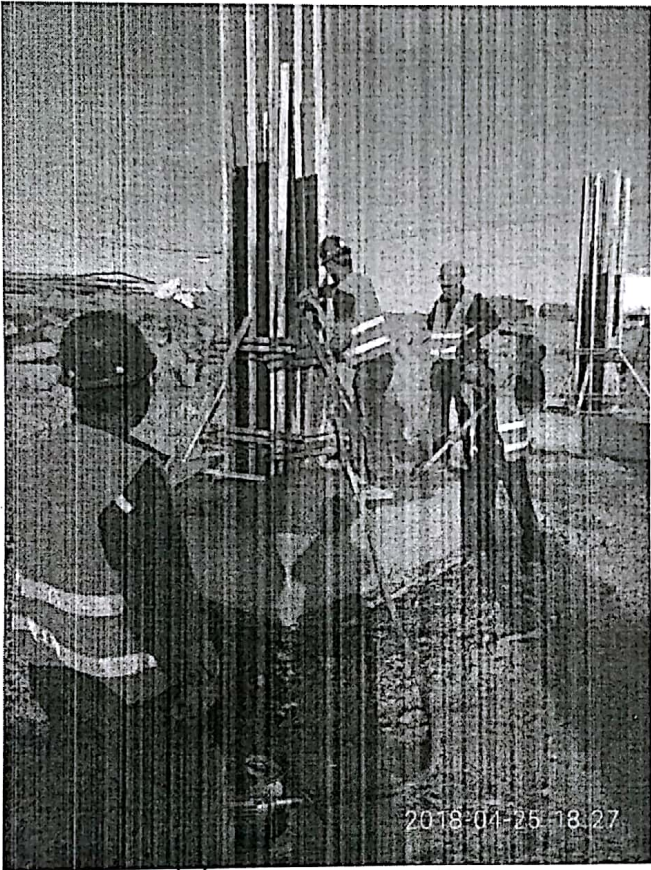


旁站监理记录表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-PZJL-003

日期及天气: 2018 年 4 月 25 日 晴 4-24℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合用房框架柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 18: 00	旁站监理结束时间: 19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 振动器 1 台, 发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 9m³。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 模板不垂直。 处理情况: 经现场整改加固后浇筑。	
旁站监理人员 (签字): 张之强 2018 年 4 月 25 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
