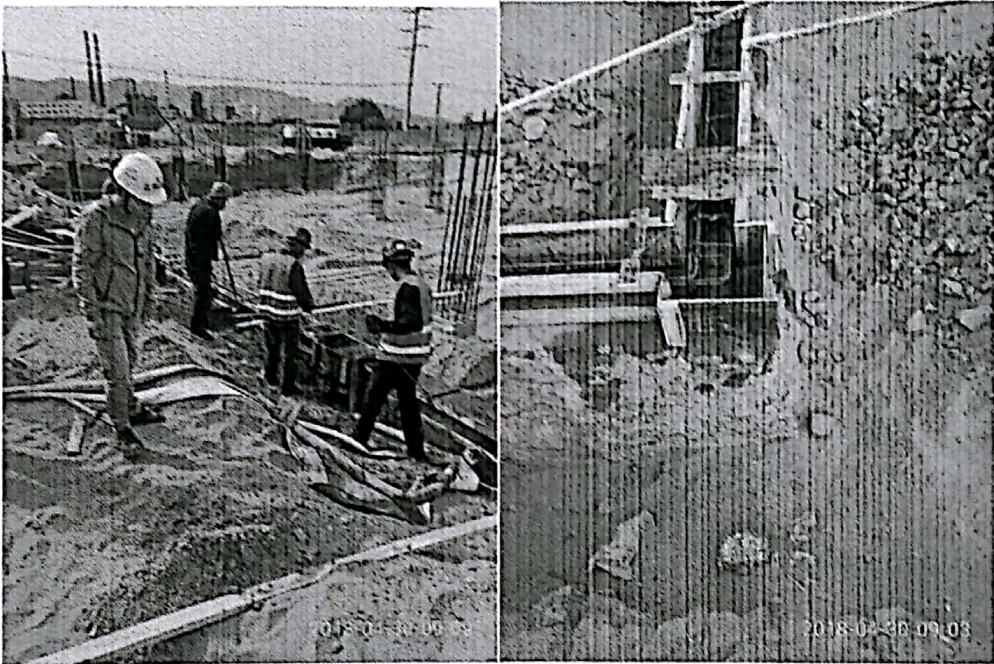


## 旁站监理记录表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-PZJL-005

|                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2018 年 4 月 30 日 多云 8-24℃                                                                                                              | 施工单位: 包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 综合用房地梁及基础柱混凝土浇筑                                                                                                                  |                  |
| 旁站监理开始时间: 08: 30                                                                                                                             | 旁站监理结束时间: 10: 50 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>1、施工单位施工人员 8 人, 振捣器 2 台, 发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 12m³。</p> |                  |
|                                                           |                  |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>问题:</p> <p>处理情况:</p>                                                                                                   |                  |
| <p>旁站监理人员 (签字): <span style="float: right;">2018 年 4 月 30 日</span></p>                                                                       |                  |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
