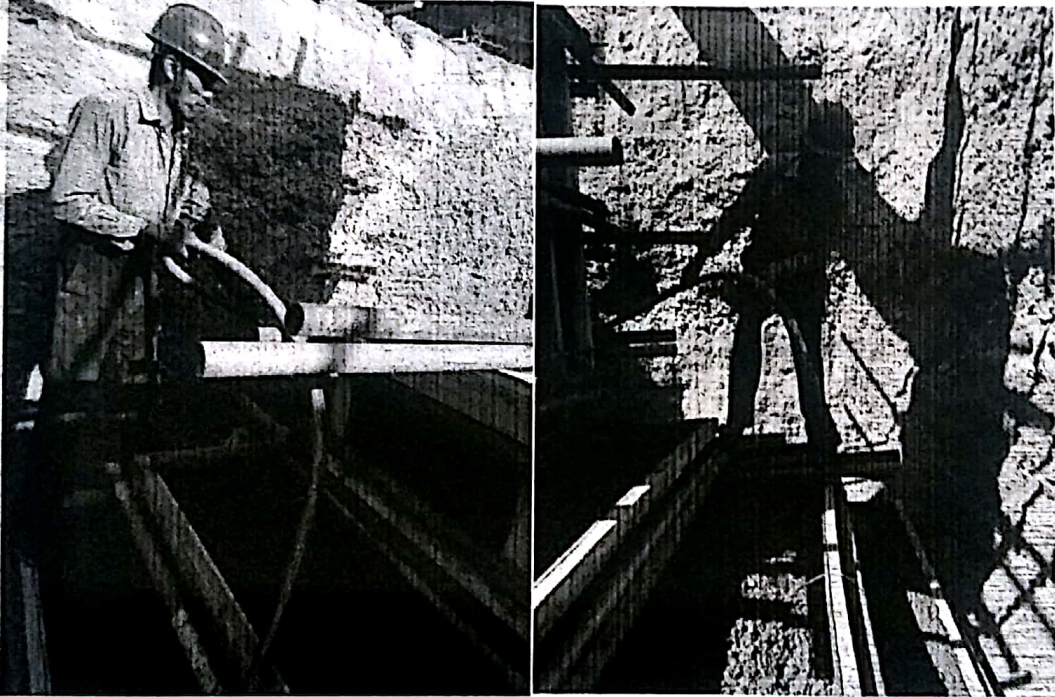


旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-021

日期及天气: 2018 年 6 月 15 日 晴 19-33℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 8、9#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 08: 30	旁站监理结束时间: 13: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 3 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 发电机 1 台, 水泥泵车 1 台, 水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米, 混凝土强度 C25, 钢筋 A12、A8、C16, 地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 6 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
