

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-001

日期及天气: 2018 年 4 月 22 日 晴 6-18℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合用房柱基垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 09: 30	旁站监理结束时间: 10: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 振动器 1 台, 发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C15, 20m³。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 部分垫层抹面不平。 处理情况: 施工人员重新修整。	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 4 月 22 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

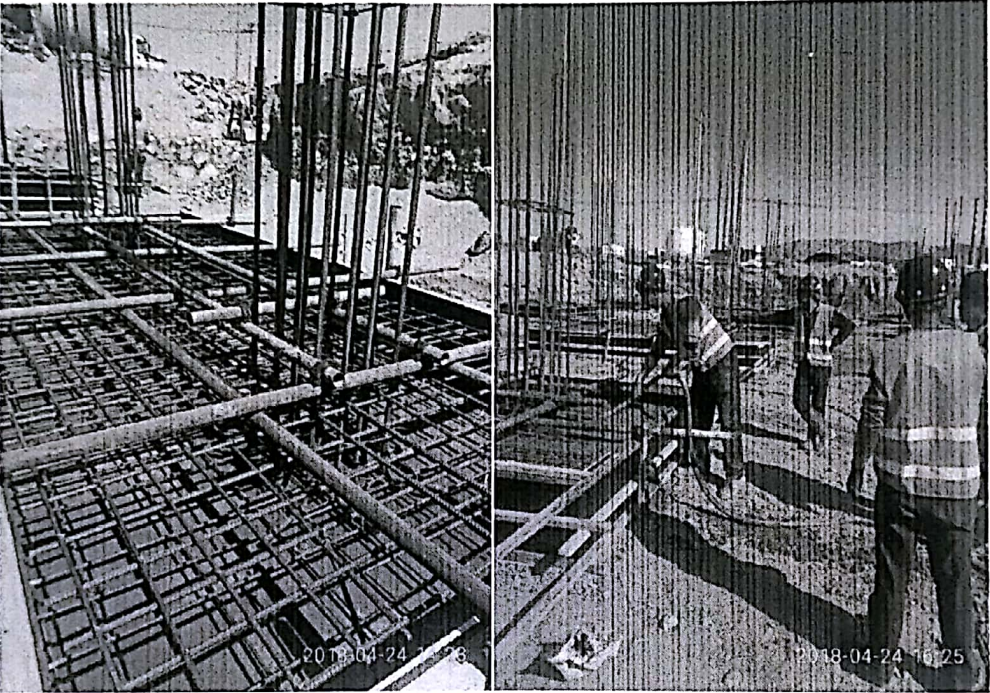


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-002

日期及天气：2018 年 4 月 24 日 晴 7-22℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房柱基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：15: 30	旁站监理结束时间：18: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 1 台，发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，81m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：钢筋绑扎间距不均匀、施工人员安全帽佩戴不规范。 处理情况：钢筋间距进行调整，安全帽现场已整改。	
旁站监理人员（签字）：张广钦 2018 年 4 月 24 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-003

日期及天气：2018 年 4 月 25 日 晴 4-24℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房框架柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：18: 00	旁站监理结束时间：19: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 1 台，发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，9m³。 	
发现的问题及处理情况： 问题：模板不垂直。 处理情况：经现场整改加固后浇筑。	
旁站监理人员（签字）：张子钦 2018 年 4 月 25 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

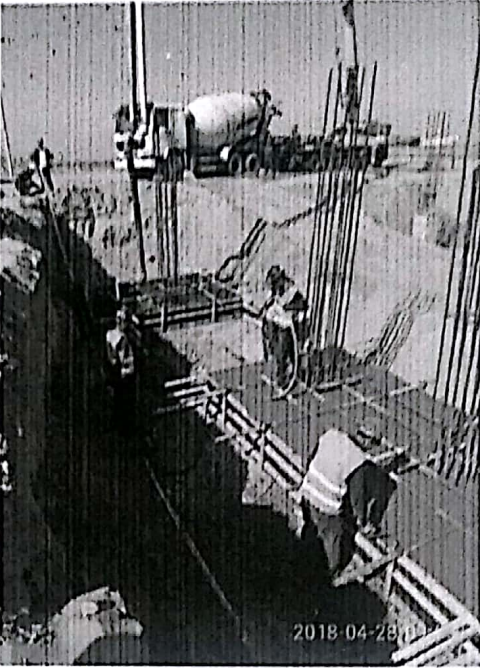


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZH-004

日期及天气：2018 年 4 月 28 日 晴 7-22℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房地梁及基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振捣器 2 台，发电机 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，20m³。	
 	
发现的问题及处理情况： 问题：基础垫块稀少。 处理情况：经现场整改后浇筑。	
旁站监理人员（签字）：张广钦 2018 年 4 月 28 日	

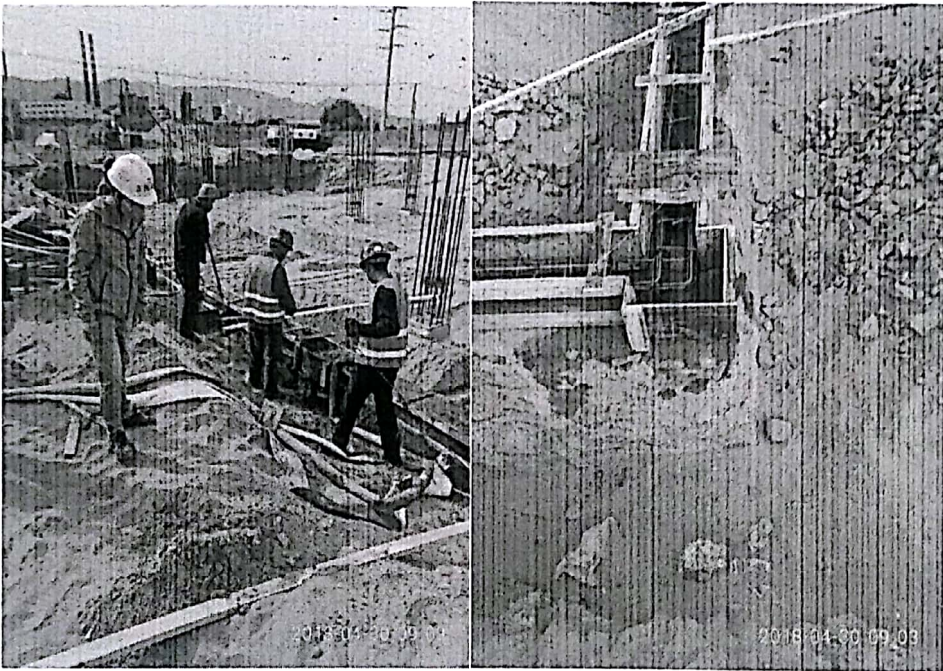
- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-005

日期及天气：2018 年 4 月 30 日 多云 8-24℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房地梁及基础柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：10:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 2 台，发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，12m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张子敬 2018 年 4 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-006

日期及天气: 2018 年 5 月 7 日 晴 11-25℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合用房托墙梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 16: 30	旁站监理结束时间: 21: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 振捣器 2 台, 发电机 1 台、商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 81m³。	
 	
发现的问题及处理情况: 问题: 托墙梁垫块稀少, 模板不直。 处理情况: 已通知施工单位现场整改, 整改完成后浇筑。	
旁站监理人员 (签字): 张广钦	2018 年 5 月 8 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

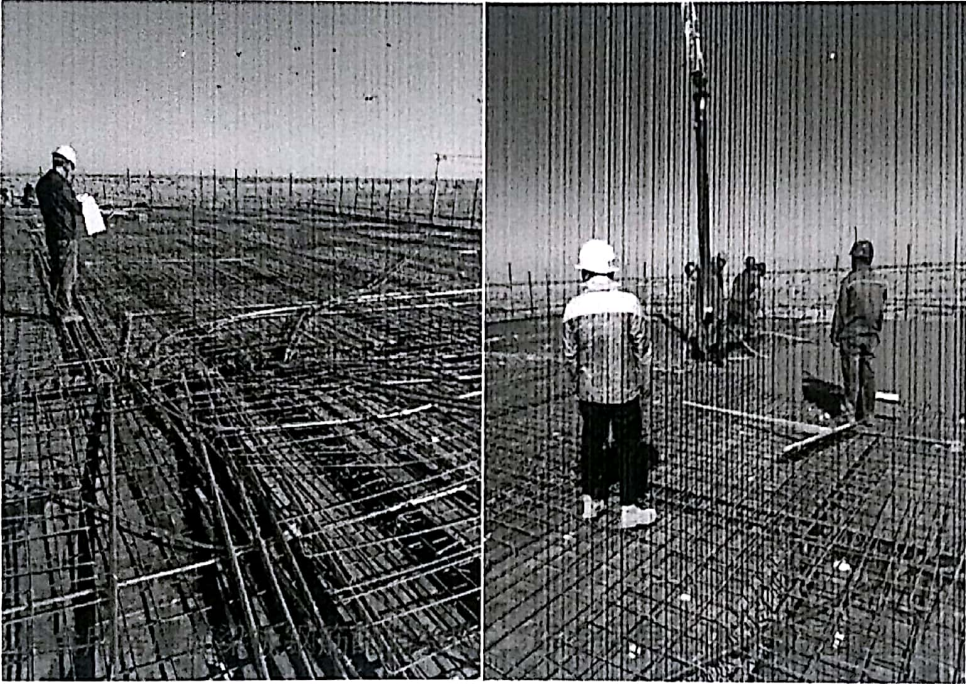


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-007

日期及天气：2018 年 5 月 23 日 晴 5-29℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：综合用房柱、梁及顶板浇筑	
旁站监理开始时间：08: 30	旁站监理结束时间：15: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 2 台，混凝土泵车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，199m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：预埋电线管接头未封口，钢筋踩踏变形。 处理情况：已通知施工单位现场整改，整改完成后浇筑。	
旁站监理人员（签字）： <u>张宁钦</u> 2018 年 5 月 23 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

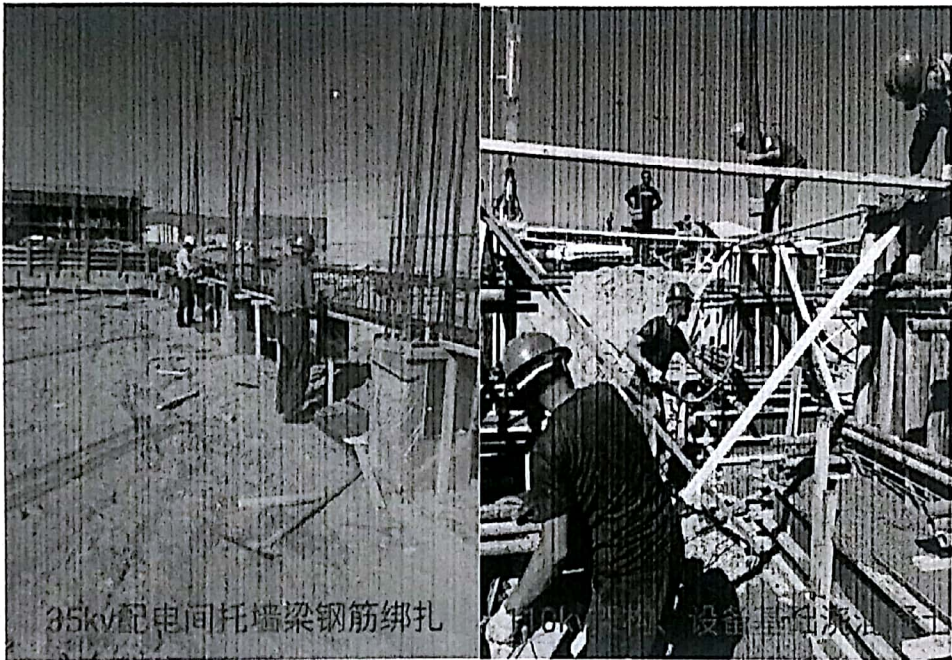


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-008

日期及天气：2018 年 5 月 28 日 晴 8-28℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：主变、架构、事故油池、地下泵房、35KV 配电间基础浇筑	
旁站监理开始时间：13：30	旁站监理结束时间：19：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振动器 2 台，混凝土泵车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，119m³。	
 35kv 配电间托墙梁钢筋绑扎 110kv 母线、设备基础浇筑	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张令敏	2018 年 5 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-009

日期及天气：2018 年 5 月 30 日 多云 12-30℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：避雷针接地扁铁焊接	
旁站监理开始时间：17: 30	旁站监理结束时间：19: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 3 人，电焊机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、接地环网基坑半径深度大于设计要求 4 米，接地环网镀锌扁钢达到设计要求 60*8。 4、扁钢与扁钢接地极焊接接触面达到设计要求，并做好防腐处理。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：陈悦彬 2018 年 5 月 30 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

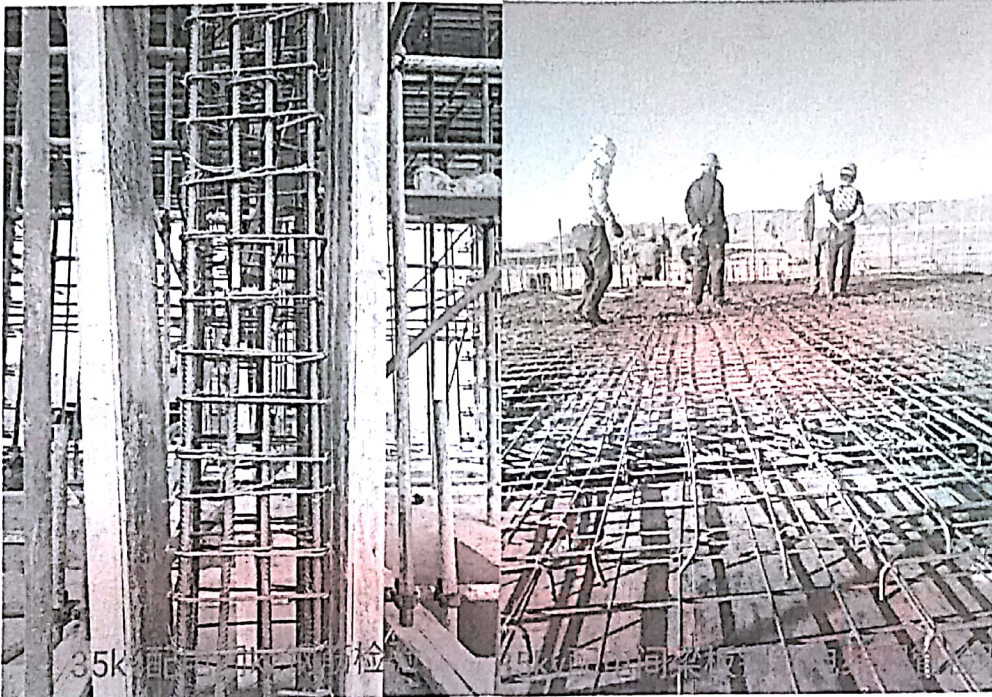


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-010

日期及天气：2018 年 6 月 3 日 阴 12-27℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 配电间主体混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：19: 50	旁站监理结束时间：21: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 6 人，振动器 2 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，39m³。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张广领</u> 2018 年 6 月 3 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

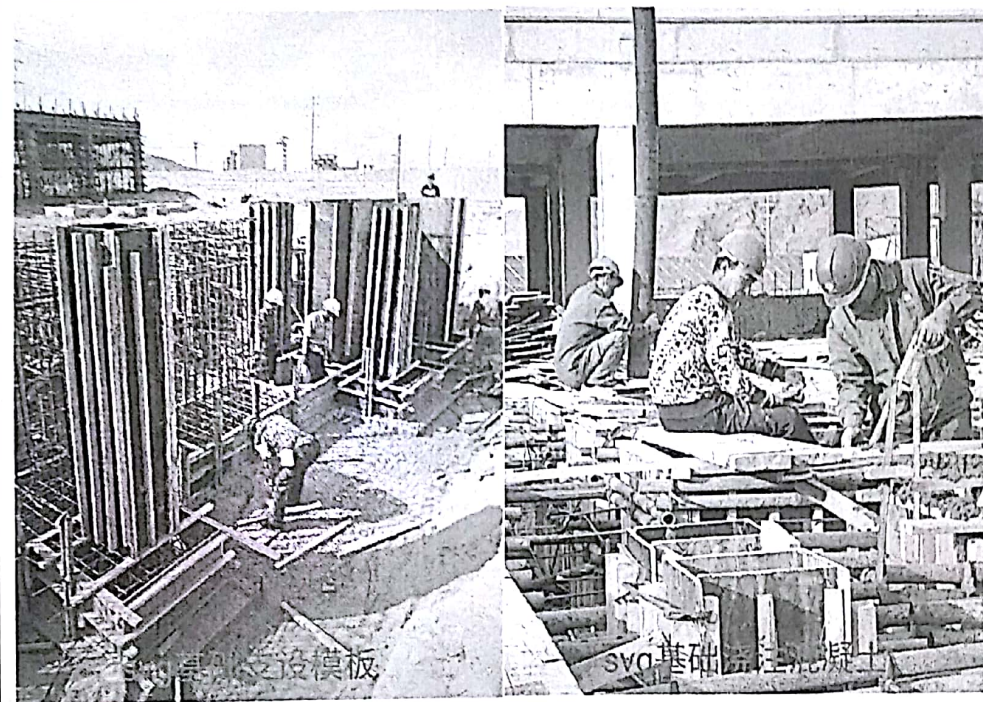



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-011

日期及天气: 2018 年 6 月 6 日 多云 16-28℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG 设备基础、地下泵房池壁、主变油池混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 19: 50	旁站监理结束时间: 22: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 振捣器 2 台, 商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 82m³。	
 基础设置模板 svg 基础浇筑混凝土	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字):	 2018 年 6 月 6 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

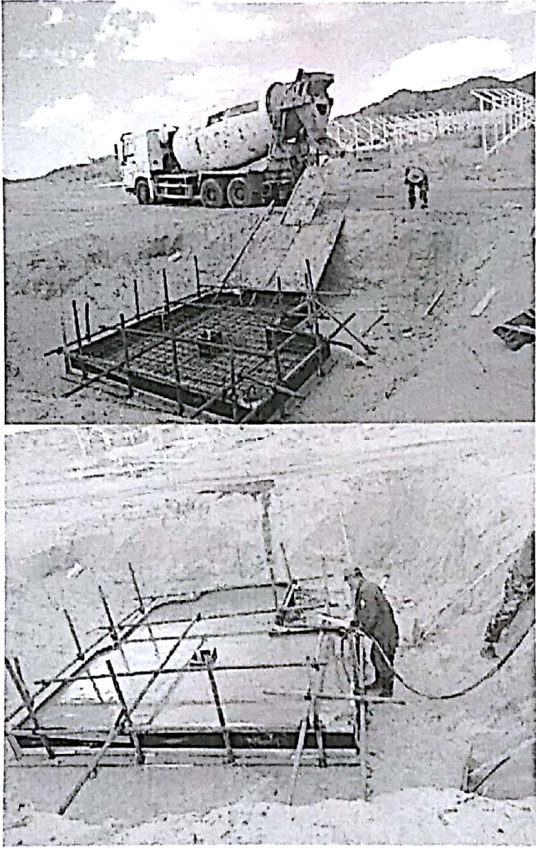



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-012

日期及天气：2018 年 6 月 6 日 多云 12-28℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 5#、6#、7#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：19: 50	旁站监理结束时间：22: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，振捣器 2 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，82m³。 	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  , 2018 年 6 月 8 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

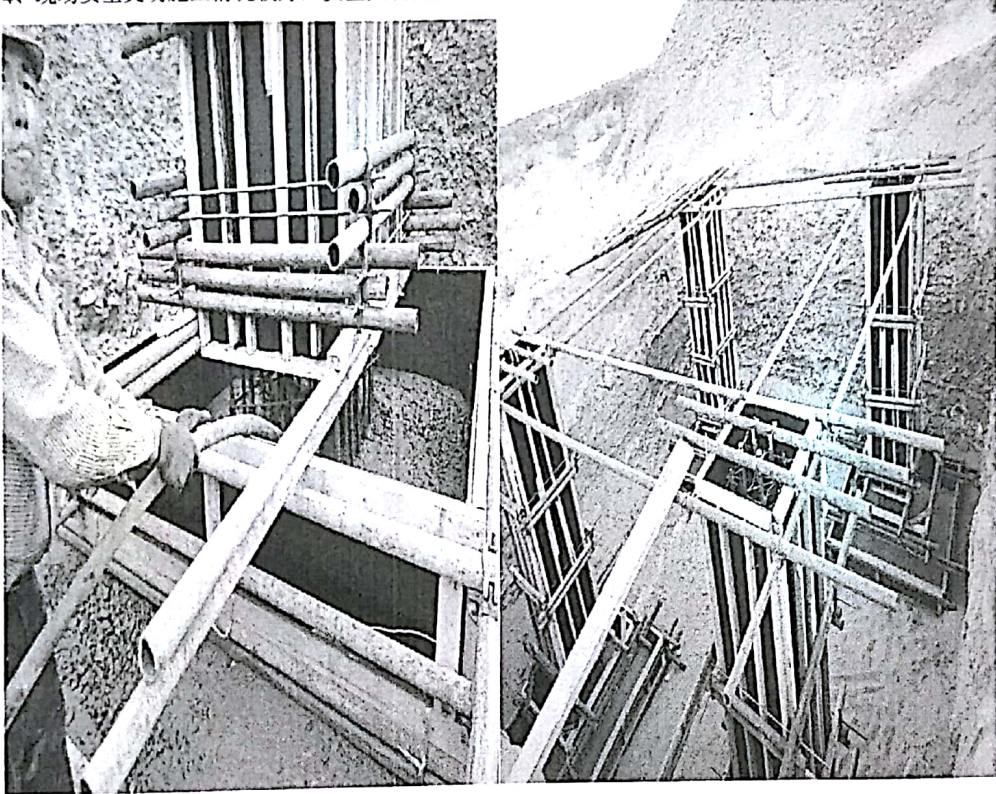


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-013

日期及天气：2018 年 6 月 8 日 多云 15-29℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：7#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：17：30	旁站监理结束时间：19：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 3 人，安全员 1 人，技术员 1 人，发电机 1 台，水泥泵车 1 台，水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米，混凝土强度 C25，钢筋 A12、A8、C16，地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	2016 年 6 月 8 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-014

日期及天气: 2018 年 6 月 9 日 晴 14-31℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 6、5#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 30	旁站监理结束时间: 19: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 3 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 发电机 1 台, 水泥泵车 1 台, 水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米, 混凝土强度 C25, 钢筋 A12、A8、C16, 地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 6 月 9 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-015

日期及天气：2018 年 6 月 10 日 晴 15-33℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：3、4#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：14: 30	旁站监理结束时间：19: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 3 人，安全员 1 人，技术员 1 人，发电机 1 台，水泥泵车 1 台，水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米，混凝土强度 C25，钢筋 A12、A8、C16，地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	2018 年 6 月 10 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZL-016

日期及天气: 2018 年 6 月 10 日 多云 15-33℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 8#、9#、10#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 19: 50	旁站监理结束时间: 22: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 振动器 2 台, 商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 82m³。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 陈晓彬 2018 年 6 月 10 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-017

日期及天气：2018 年 6 月 11 日 晴 15-34℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：2、16#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：14：30	旁站监理结束时间：19：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 3 人，安全员 1 人，技术员 1 人，发电机 1 台，水泥泵车 1 台，水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米，混凝土强度 C25，钢筋 A12、A8、C16，地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：王学东 2018 年 6 月 11 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海市开电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZL-018

日期及天气: 2018 年 6 月 12 日 晴 15-35℃	施工单位: 包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序: 14、1#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 30	旁站监理结束时间: 19: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 3 人, 安全员 1 人, 技术员 1 人, 发电机 1 台, 水泥泵车 1 台, 水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米, 混凝土强度 C25, 钢筋 A12、A8、C16, 地脚螺栓 M12。 4、现场安全文明施工情况较好, 安全文明标志标牌齐全, 施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 王峰东 2018 年 6 月 12 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 乌海市升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

编号: WHT-2017-0125

日期及天气: 2017年6月13日 晴 15-31℃

施工单位: 包头青山电业有限责任公司

旁站监理的部位或工序: 12、13#塔基基础浇筑

旁站监理开始时间: 14: 30

旁站监理结束时间: 15: 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工单位施工人数3人, 安全员1人, 技术员1人, 发电机1台, 水泥泵车1台, 水准仪等2台。
2. 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
3. 铁塔基础深度设计要求4.22米, 混凝土强度 C25, 钢筋 HRB、HR、C30, 地基承载力 140kPa。
4. 现场安全文明施工情况较好, 安全文明施工标识牌齐全, 施工人员进行佩戴安全帽。



发现的问题及处理情况:

问题:

处理情况:

旁站监理人员(签字): 王学东,

2017 年 6 月 13 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在表后附设“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程暂停令要求施工单位进行整改。
3. 本表一式一份, 监理单位留存。

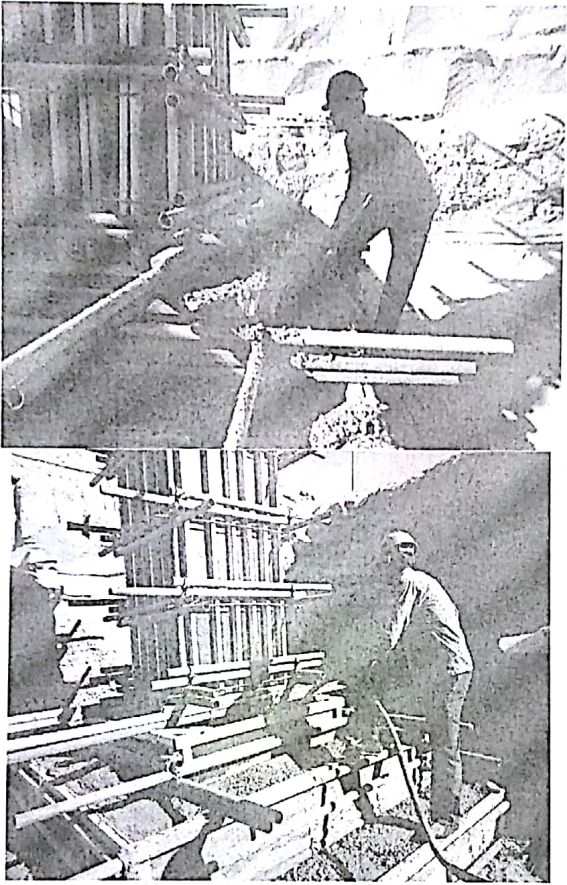



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-020

日期及天气：2018 年 6 月 14 日 晴 19-33℃	施工单位：包头青山电器有限公司
旁站监理的部位或工序：11、15#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：14：30	旁站监理结束时间：19：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 3 人，安全员 1 人，技术员 1 人，发电机 1 台，水泥泵车 1 台，水泥罐车 2 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、铁塔基础深度设计要求 4.22 米，混凝土强度 C25，钢筋 A12、A8、C16，地脚螺栓 M42。 4、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2018 年 6 月 14 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
