

## 旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZIL-022

|                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2018 年 6 月 17 日 晴 17-31℃                                                                                                                                                     | 施工单位: 包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区 5#-10#箱变圈梁混凝土浇筑, 预埋件安装                                                                                                                                              |                  |
| 旁站监理开始时间: 9: 30                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间: 11: 30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位施工人员 8 人, 振动器 2 台, 商砼罐车准备就绪。</li> <li>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</li> <li>3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 12m³。</li> </ol> |                  |



工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目  
施工部位: 箱变圈梁浇筑  
日期: 2018 年 06 月 17 日

2018/06/17 10:35



工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目  
施工部位: 箱变圈梁浇筑  
日期: 2018 年 06 月 17 日

2018/06/17 09:39



由 扫描全能王 扫描创建



发现的问题及处理情况:

问题:

处理情况:

旁站监理人员(签字): 徐卫国

2018年6月17日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。



## 旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PZJL-023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2018 年 6 月 17 日 晴 17-31℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位: 包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区拉拔试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 旁站监理开始时间: 9: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间: 17: 30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况:<br>1、5#-10#光伏区螺旋桩进行拉拔试验。<br>2、现场试验人员 3 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <div>  <p>工程名称: 乌海宇升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目</p> <p>施工部位: 光伏区抗压实验</p> <p>日期: 2018年06月17日</p> <p>2018/06/17 10:39</p> </div> <div>  <p>工程名称: 乌海宇升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目</p> <p>施工部位: 光伏区拉拔实验</p> <p>日期: 2018年06月17日</p> <p>2018/06/17 10:45</p> </div> |                  |
| 发现的问题及处理情况:<br>问题:<br>处理情况:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 旁站监理人员 (签字): 张子钦 2018 年 6 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-024

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 20 日 阵雨 19-34℃                                                                                                                            | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 9#、10#、12#、13#铁塔组立                                                                                                                           |                 |
| 旁站监理开始时间：7: 30                                                                                                                                             | 旁站监理结束时间：20: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。</p> |                 |
|                                                                         |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                 |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子钦</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 20 日</p>                                                                                    |                 |

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-025

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 21 日 多云 18-34℃                                                                                                                            | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 4#、5#、6#铁塔组立                                                                                                                                 |                 |
| 旁站监理开始时间：8：30                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：18：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。</p> |                 |
|                                                                         |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                 |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 21 日</p>                                                                                    |                 |

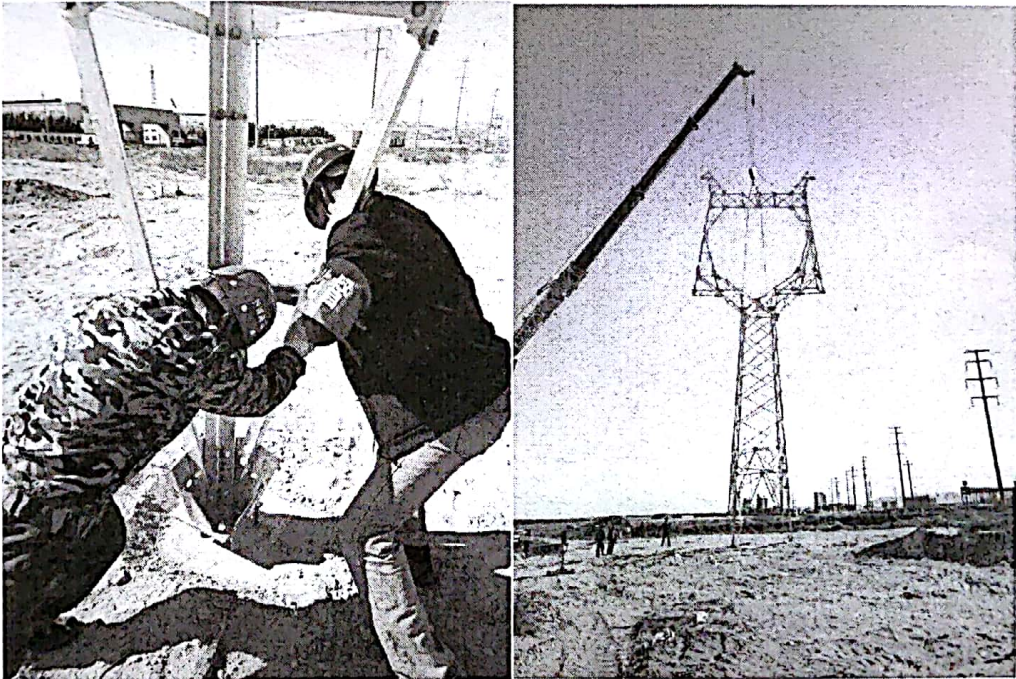
- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-026

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 22 日 晴 22-37℃                                                                                                                             | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 3#铁塔组立                                                                                                                                       |                 |
| 旁站监理开始时间：9：30                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：12：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。</p> |                 |
|                                                                         |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                 |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张之敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 22 日</p>                                                                                    |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

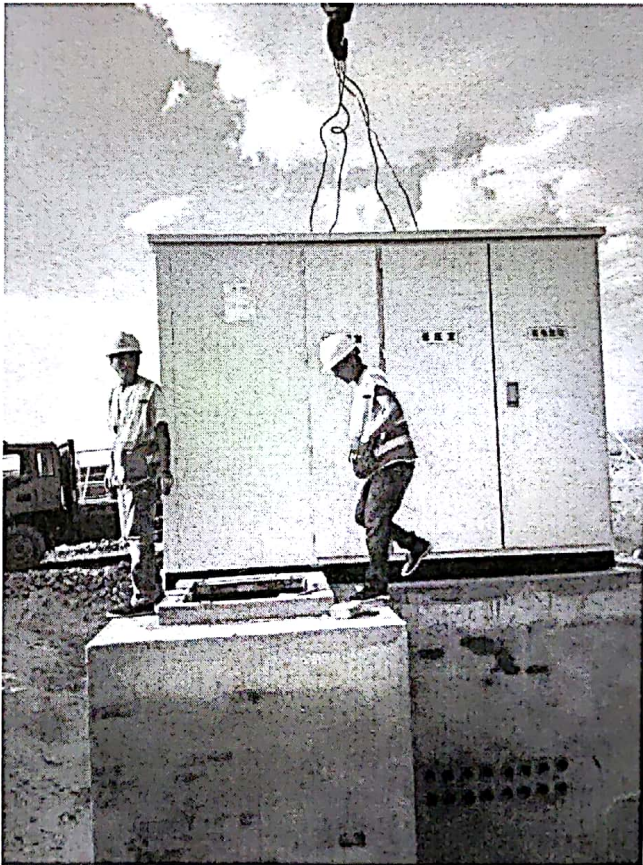


由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-027

|                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 22 日 晴 22-37℃                                                                                                                         | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 5#、7#、9#组串式箱变吊装                                                                                                                         |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 30                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：18: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                                     |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                             |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 22 日</p>                                                                                |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-028

|                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 22 日 晴 22-37℃                                                                                                                   | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 5#-10#箱变电缆头制作                                                                                                                     |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 30                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间：18: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                               |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                       |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子钦</p>                                                                                                                            |                 |
| 2018 年 6 月 22 日                                                                                                                                  |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-029

|                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 23 日 阴 21-34℃                                                                                                                         | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 6#、8#、10#集中式箱变吊装                                                                                                                        |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 30                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：18: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                                     |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                             |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 23 日</p>                                                                                |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-030

|                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 23 日 阴 21-34℃                                                                                                                         | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 5#、7#、9#组串式箱变接地                                                                                                                         |                 |
| 旁站监理开始时间：8：30                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：18：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                                     |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                             |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张之敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 23 日</p>                                                                                |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-031

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 24 日 多云 18-28℃                                                                                                                            | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 1#、11#、14#、15#铁塔组立                                                                                                                           |                 |
| 旁站监理开始时间：8：30                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：19：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。</p> |                 |
|                                                                         |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                 |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 24 日</p>                                                                                    |                 |

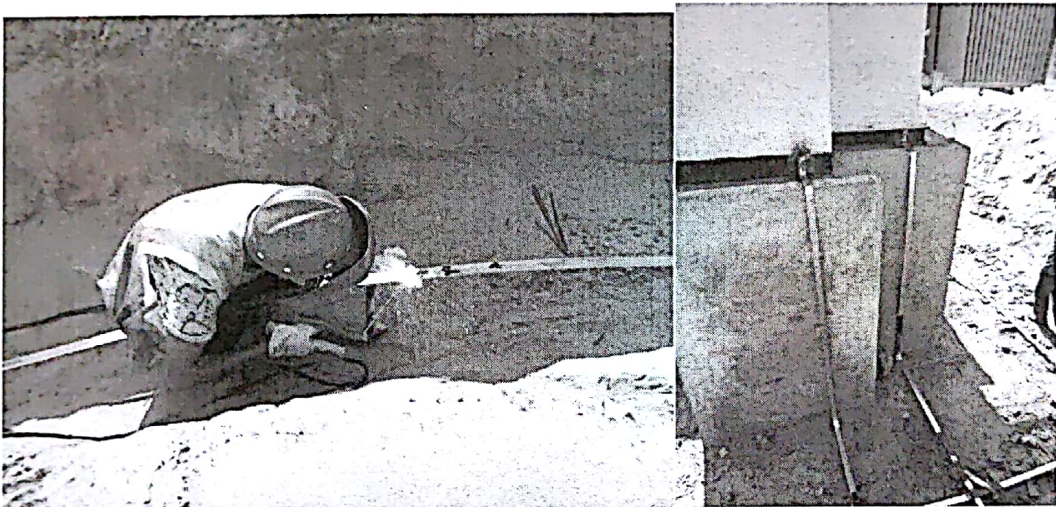
- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-032

|                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 24 日 多云 18-28℃                                                                                                                 | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 6#、8#、10#集中式箱变接地                                                                                                                 |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 30                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间：18: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 10 人，安全员 1 人，技术员 1 人。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                              |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                      |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 24 日</p>                                                                         |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

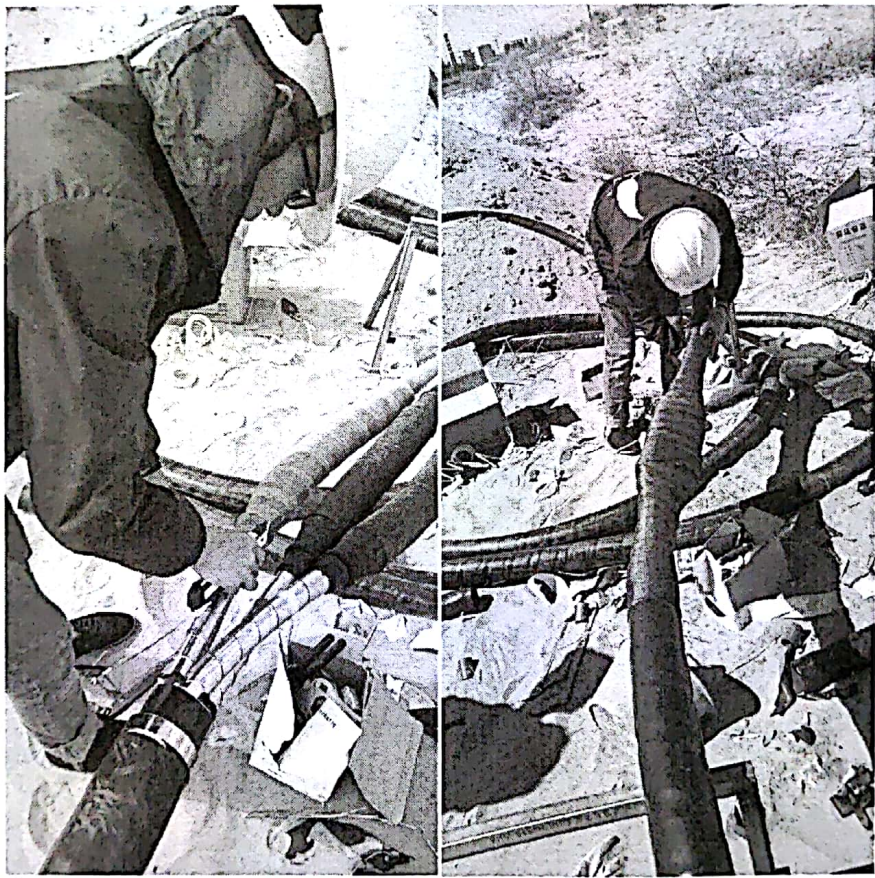


由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-033

|                                                                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 24 日 多云 18-28℃                                                                                                                | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 10#箱变至升压站中间电缆头制作                                                                                                                |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 30                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：18: 00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 5 人，安全员 1 人，技术员 1 人。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                             |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                     |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张之钦</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 24 日</p>                                                                        |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

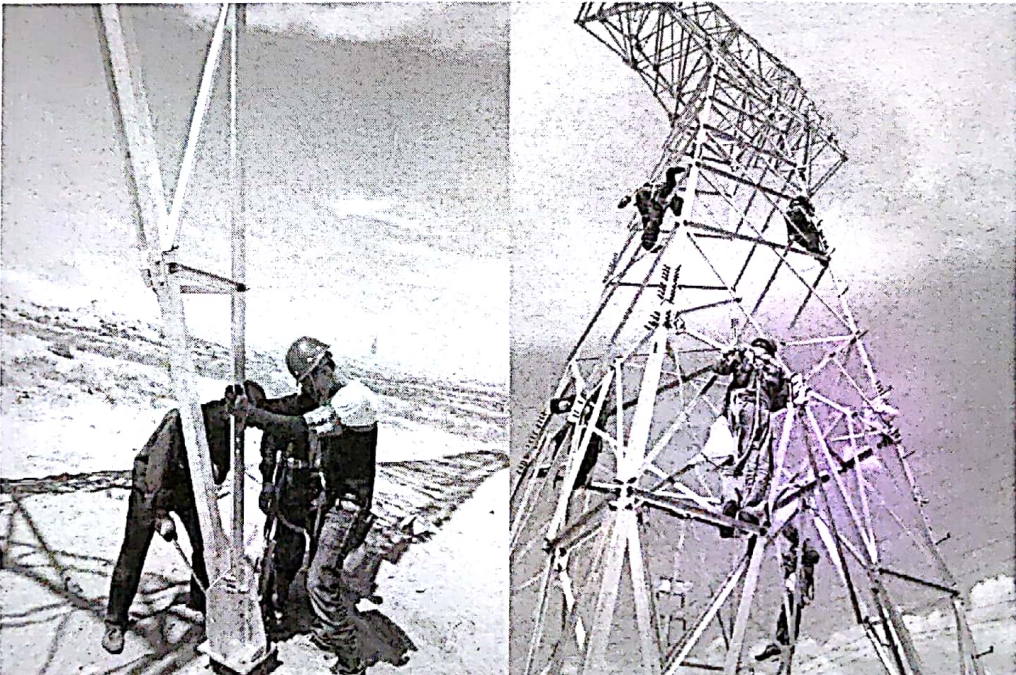


由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZIL-034

|                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 25 日 多云 21-33℃                                                                                                                             | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 2#、7#、8#铁塔组立                                                                                                                                  |                 |
| 旁站监理开始时间：8：30                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：19：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 25 人，安全员 1 人，技术员 1 人，吊车 1 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽、安全带。</p> |                 |
|                                                                          |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                  |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子敏</p>                                                                                                                                       |                 |
| <p>2018 年 6 月 25 日</p>                                                                                                                                      |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 旁站监理记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-PZJL-035

|                                                                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2018 年 6 月 25 日 多云 21-33℃                                                                                                                | 施工单位：包头青山电器有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：外线 15#铁塔电缆头制作                                                                                                                       |                 |
| 旁站监理开始时间：11：30                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：19：00  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 5 人，安全员 1 人，技术员 1 人。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全，施工人员均佩戴安全帽。</p> |                 |
|                                                             |                 |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                     |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）：张子钦</p> <p style="text-align: right;">2018 年 6 月 25 日</p>                                                                        |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建
