


旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH—SJC-34

日期及气候: 2018.05.28 多云 21℃-28℃		施工地点: 光伏一期场内	
旁站监理的部位或工序: 1#SVG、2#SVG 基础浇筑			
旁站监理开始时间: 2018.05.28 7:00		旁站监理结束时间: 2018.05.28 9:30	
施工情况: 1、施工人员 12 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2、基础砼为商品混凝土 c40, 泵车连续浇筑; 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求; 5、施工工具: 插入式振动棒 2 根; 6、设计塌落度: 120±30mm。			
监理情况: 1、基础浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c40; 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3、c40 现场检查塌落度实测值为 140mm; 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆; 5、钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求; 6、浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; 7、c40 留试块 1 组。			
发现问题: 1、2#SVG 基础钢筋不符合设计要求。			
处理意见: 1、必须严格按图施工。			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: _____ 质 检 员: <u>王明</u> 日 期: 2018 年 5 月 28 日		项目监理机构: _____ 旁站监理人员: <u>赵志</u> 日 期: 2018 年 5 月 28 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____

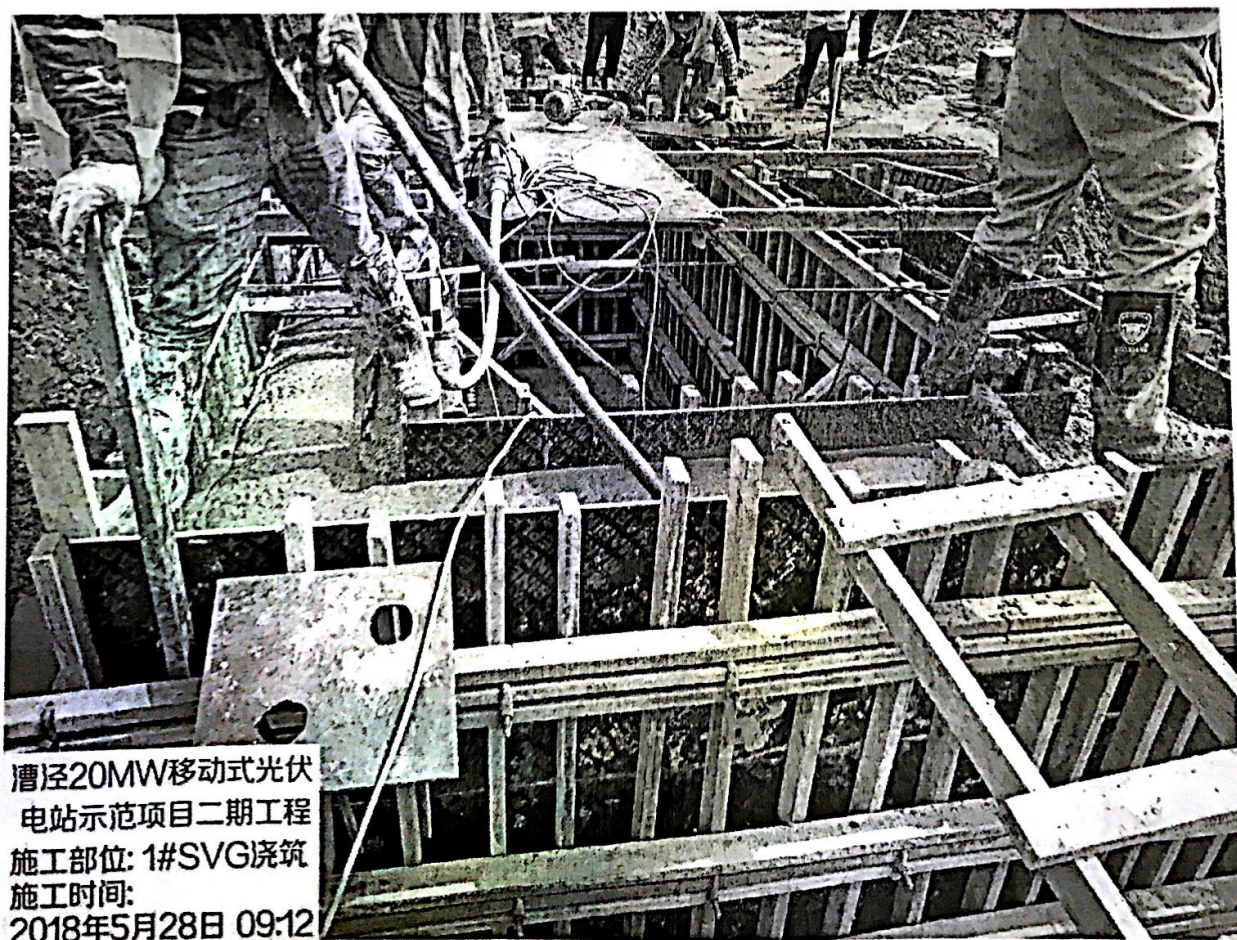

槽径20MW移动式光伏
电站示范项目二期工程
施工部位: 1#SVG浇筑
施工时间:
2018年5月28日 09:12
