

# 旁站监理记录表

工程名称:上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号:CZZH—SJC-35

日期及气候: 2018.05.30 多云 18℃-25℃

施工地点: 光伏一期场内

旁站监理的部位或工序: 1#SVG 基础浇筑

旁站监理开始时间: 2018.05.30 16:00

旁站监理结束时间: 2018.05.30 17:00

## 施工情况:

1. 施工人员 10 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
2. 基础砼为商品混凝土 c40 浇筑;
3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
4. 混凝土浇筑过程符合设计要求;
5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根;
6. 设计塌落度: 120±30mm。

## 监理情况:

1. 条机浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c40;
2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全;
3. c40 现场检查塌落度实测值为 120mm;
4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆;
5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求;
6. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;
7. c40 留试块 1 组。

## 发现问题:

无

## 处理意见:

无

## 备注 (包括处理结果):

无

承包单位: \_\_\_\_\_

项目监理机构: \_\_\_\_\_

质检员: 李朋


旁站监理人员: 李培

日期: 2018 年 5 月 30 日

日期: 2018 年 8 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存\_\_\_\_\_



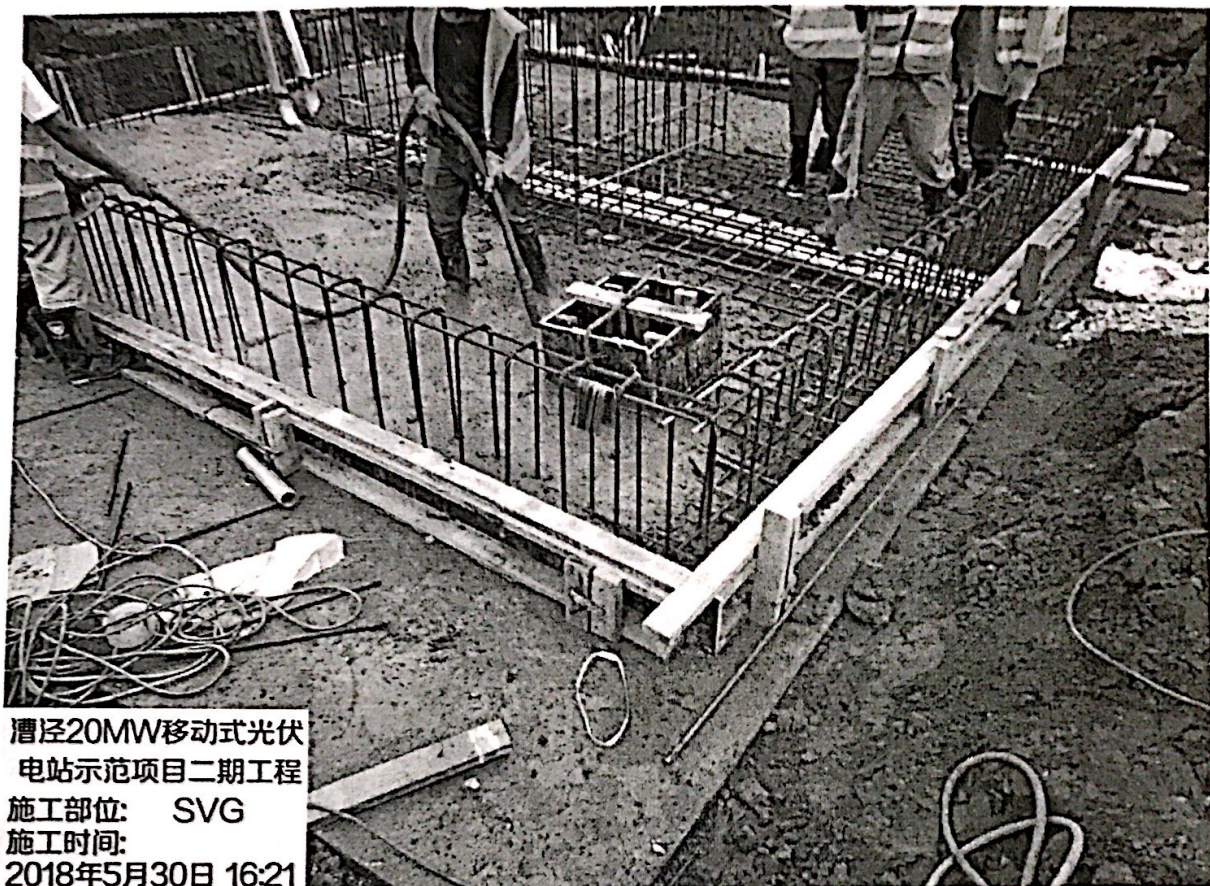

槽径20MW移动式光伏  
电站示范项目二期工程  
施工部位: SVG  
施工时间:  
2018年5月30日 16:21
