


旁站监理记录表

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CZZH-SJC-36

日期及气候: 2018.06.01 晴 16℃-27℃		施工地点: 光伏一期场内	
旁站监理的部位或工序: 1#SVG、2#SVG 基础浇筑			
旁站监理开始时间: 2018.06.01 12:00		旁站监理结束时间: 2018.06.01 16:00	
施工情况: 1. 施工人员 10 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; 2. 基础砼为商品混凝土 c40 浇筑; 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求; 5. 施工工具: 插入式振动棒 1 根; 6. 设计塌落度: 120±30mm。			
监理情况: 1. 条机浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c40; 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全; 3. c40 现场检查塌落度实测值为 120mm; 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆; 5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求; 6. 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测;			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: <u>上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期</u> 质 检 员: <u>李心</u> 日 期: 2018 年 06 月 01 日		项目监理单位: <u>常州弘毅</u> 旁站监理人员: <u>王长春</u> 日 期: 2018 年 06 月 01 日	

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存

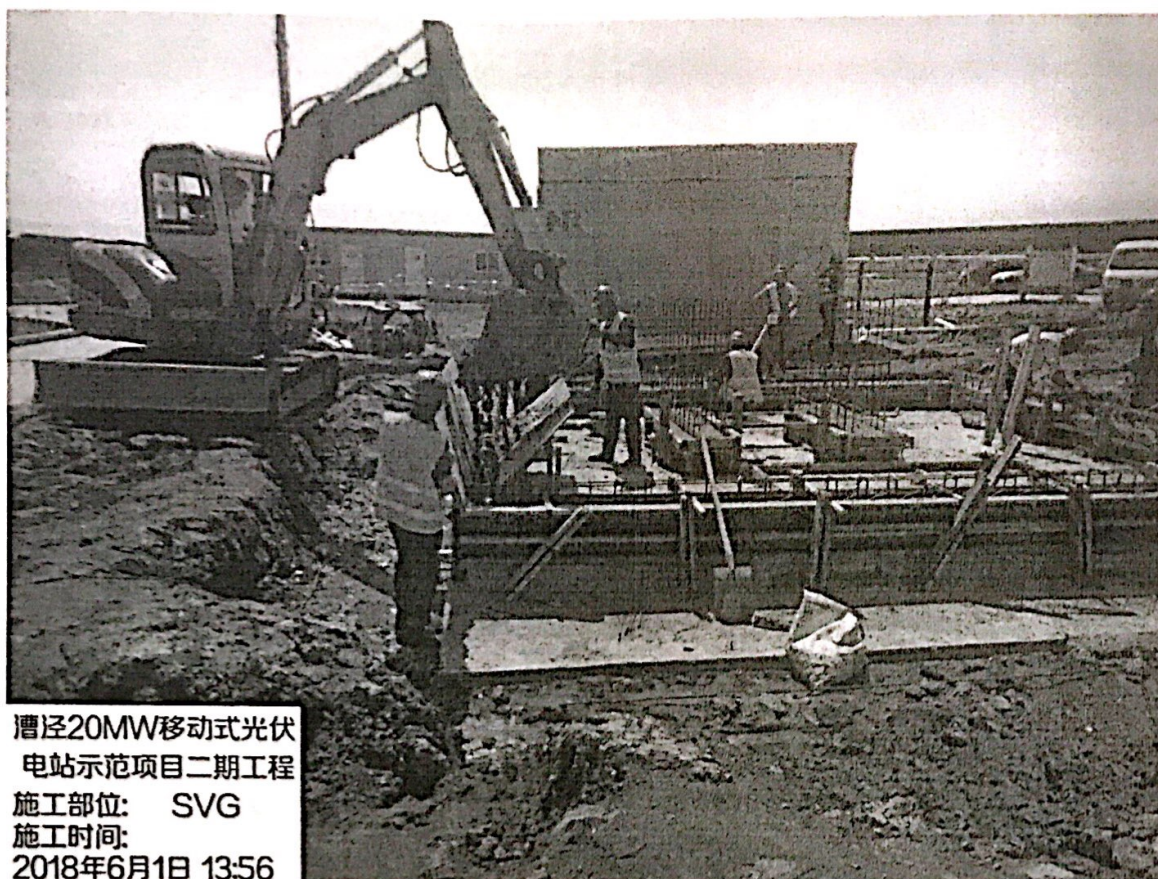

槽径20MW移动式光伏
电站示范项目二期工程
施工部位: SVG
施工时间:
2018年6月1日 13:56
