

旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-006

日期及气候：2018年7月20日 晴

工程地点：墙面至2#配电室路面

旁站监理的部位或工序：电缆沟回填及浇筑

旁站监理开始时间：15:00



旁站监理结束时间：18:00

施工情况：

1. 现场负责人1名，技术人员1名，施工人员2名、张机
2. 制定完整的技术安全措施并技术交底

监理情况：

1. 管理人员及施工人员状态良好，机具及特种工证件齐全有效
2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全
3. 检查商砼出厂证明、合格证，要求现场制作试块，标准养护试件作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振捣器插点均匀。连续震动时间约为25s-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。

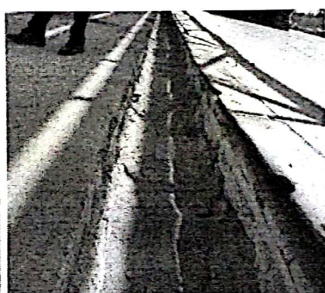

发现的问题及处理情况：个别混凝土振捣不匀，要求施工方继续对不匀处振捣。

施工单位：

质 检 员：

中机国信
张机

2018年7月20日

项目监理机构：

旁站监理人员：

正德监理
张小雄 张良玉

2018年7月20日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。
