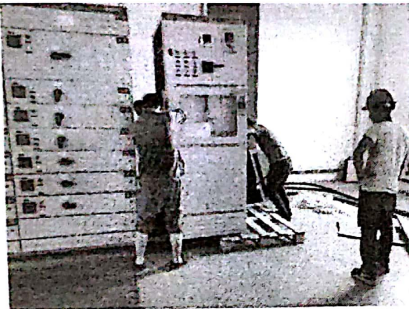


旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-008

日期及气候：2017.07.30 多云 转大雨	工程地点：南京市溧水经济开发区滨淮大道109号 南京长安发动机制造有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#并网柜安装	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将并网柜用叉车卸到配电室，并网柜放置相应电缆沟位置上方，然后将并网柜接线。   监理情况： 现场监理人员要求安装人员做好安全防护，检查进并网柜的电缆绝缘，另外在并网柜接线的同时配备灭火器防止热缩的时候的安全隐患，热缩时不合格的要求施工方进行调整，并网柜接配电室的设备时检查厂区总开关是否关闸防止触电。经检查安装质量符合要求。 发现的问题及处理情况： 个别线缆热缩管不理想，已要求施工方现场整改。 旁站监理人员（签字）：张小雄 张良至 2017年8月1日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
