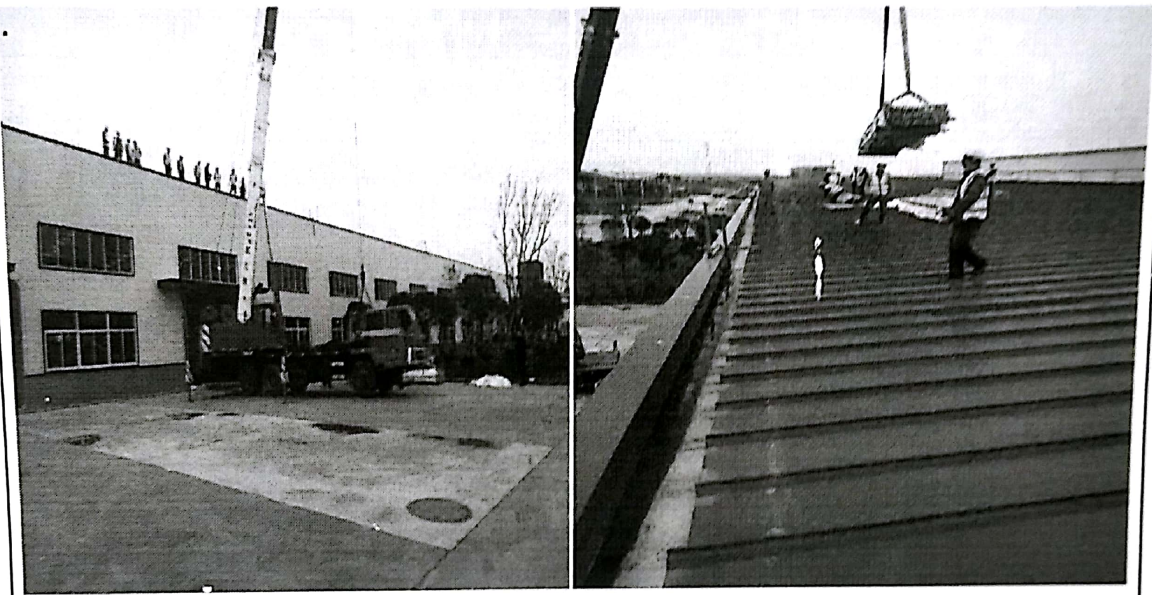


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMW-H-ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2018 年 9 月 28 日	施工单位: 湖北万道森建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 材料吊装	
旁站监理开始时间: 8: 20	旁站监理结束时间: 10: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
现场采用吊车进行吊装作业, 检查吊车最大起吊量, 符合现场起吊重量, 施工现场人员均能佩戴安全帽, 现场安全管理人员 3 人, 屋面搬运作业 10 人, 2 人负责协调起吊堆放区域	
	
发现的问题及处理情况:	
1. 现场安全防范符合要求, 配备 3 人进行沟通及管理 2. 导轨调运至屋面能及时搬运散开, 避免由于集中堆载造成屋面的损坏 3. 现场施工人员均能佩戴其安全帽进行施工搬运 4. 吊装区域未按要求设立安全警戒线围挡-----已现场通知进行整改	
 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部 王道春	
旁站监理人员(签字):	2018 年 9 月 28 日
