

旁站监理记录表


工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2018.11.04 晴	施工单位: 安徽福慧多电气有限公司
旁站监理的部位或工序: 现场车棚基础土方开挖	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 4 日 9 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 4 日 15 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、现场车棚基础土方开挖共挖机一台, 6 人配合施工;
- 2、现场车棚基础土方开挖时因地下管线较多, 部分进行人工开挖;
- 3、现场基础土方开挖要求深度为 1.2m, 长为 0.8m, 宽为 0.8m。

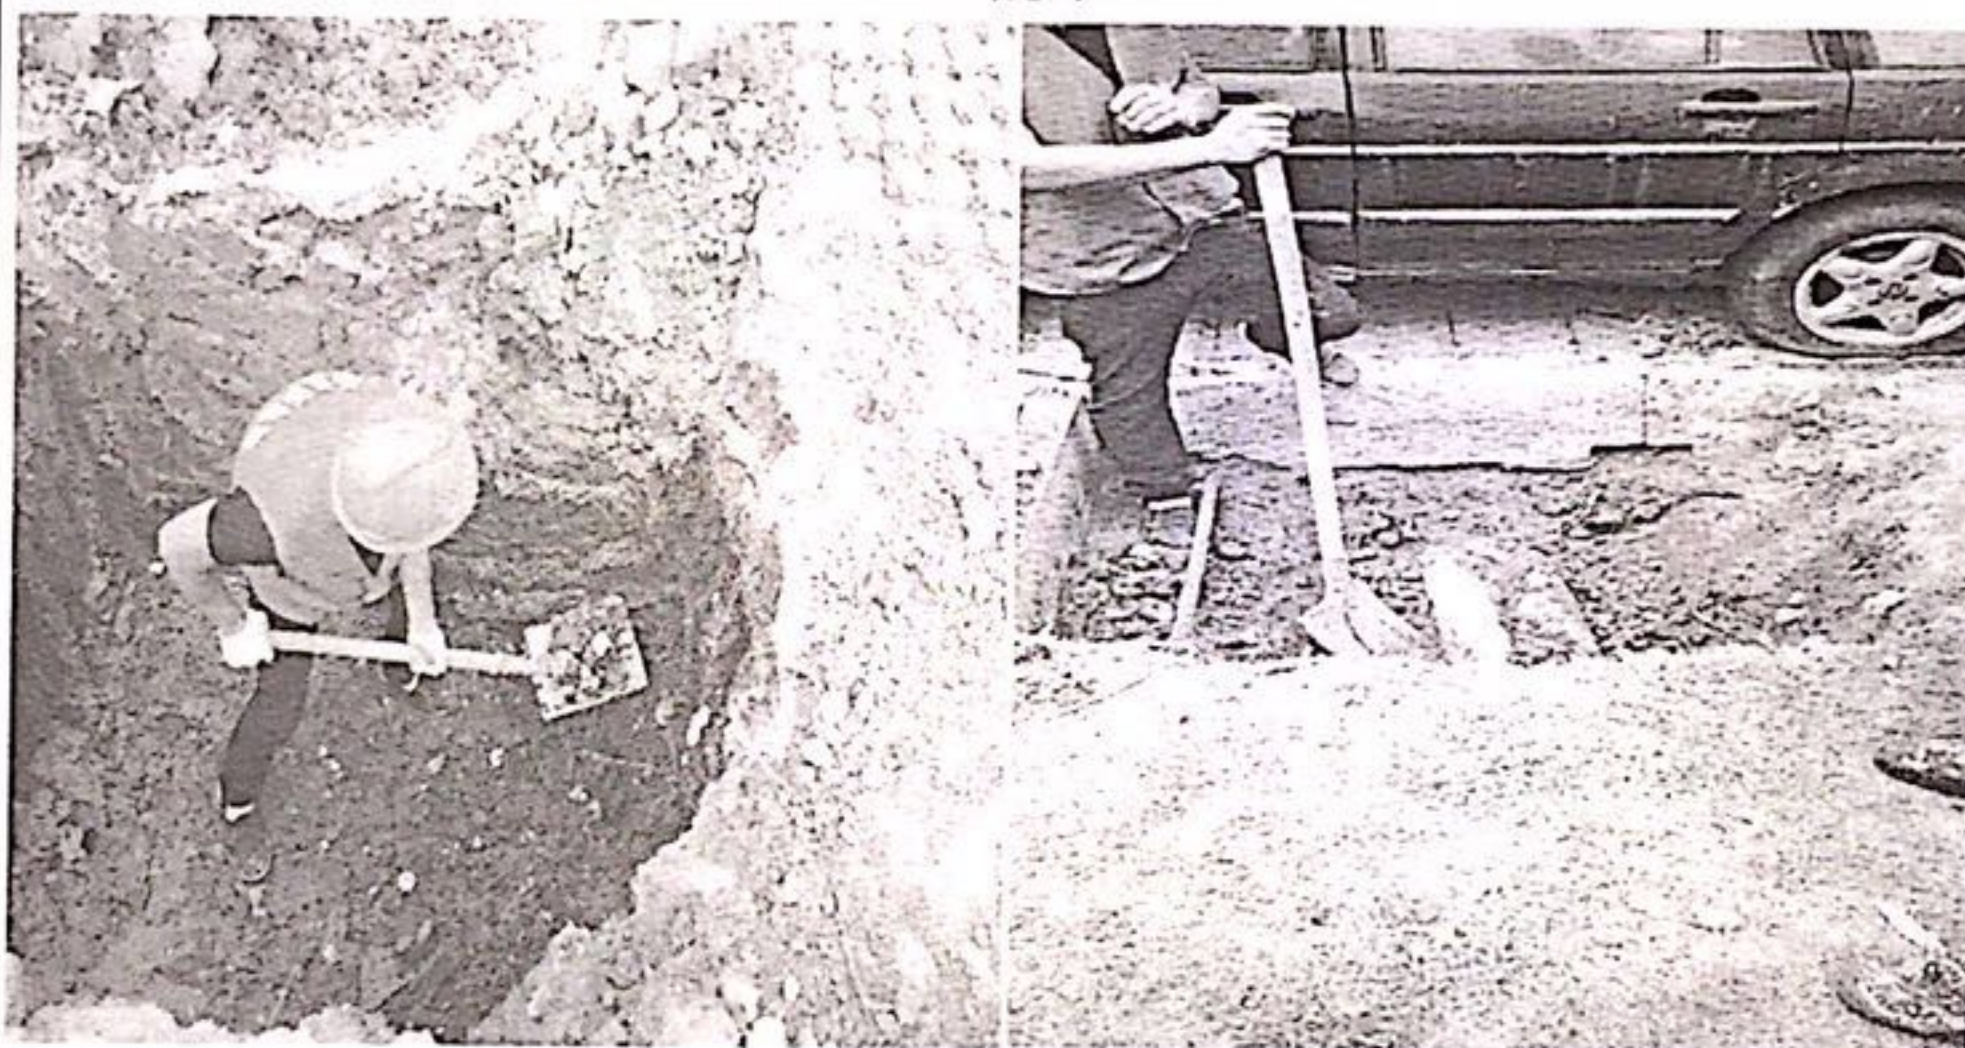

发现的问题及处理情况:

现场车棚基础深度不够, 已现场测量并要求继续进行土方开挖, 达到设计要求 1.2m。

旁站监理人员 (签字): 张本仁 .

2018 年 11 月 4 日
