



旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目 编号：NQFP-ZHJL-PZ-001

日期：2018 年 11 月 8 日 天气：晴	施工单位：苏州腾晖光伏技术有限公司
旁站监理的部位或工序：郑家坝桩基浇筑	
旁站开始时间：2018 年 11 月 8 日 09 时 10 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 8 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器数量 2 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 3 人、模板工 2 人、安装人员 0 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、垫层底板上或模板内是☒否☐已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否☒已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 9、混凝土标号 C30，浇筑 6 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，是☒否☐符合要求。 10、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☒否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2018 年 11 月 8 日	



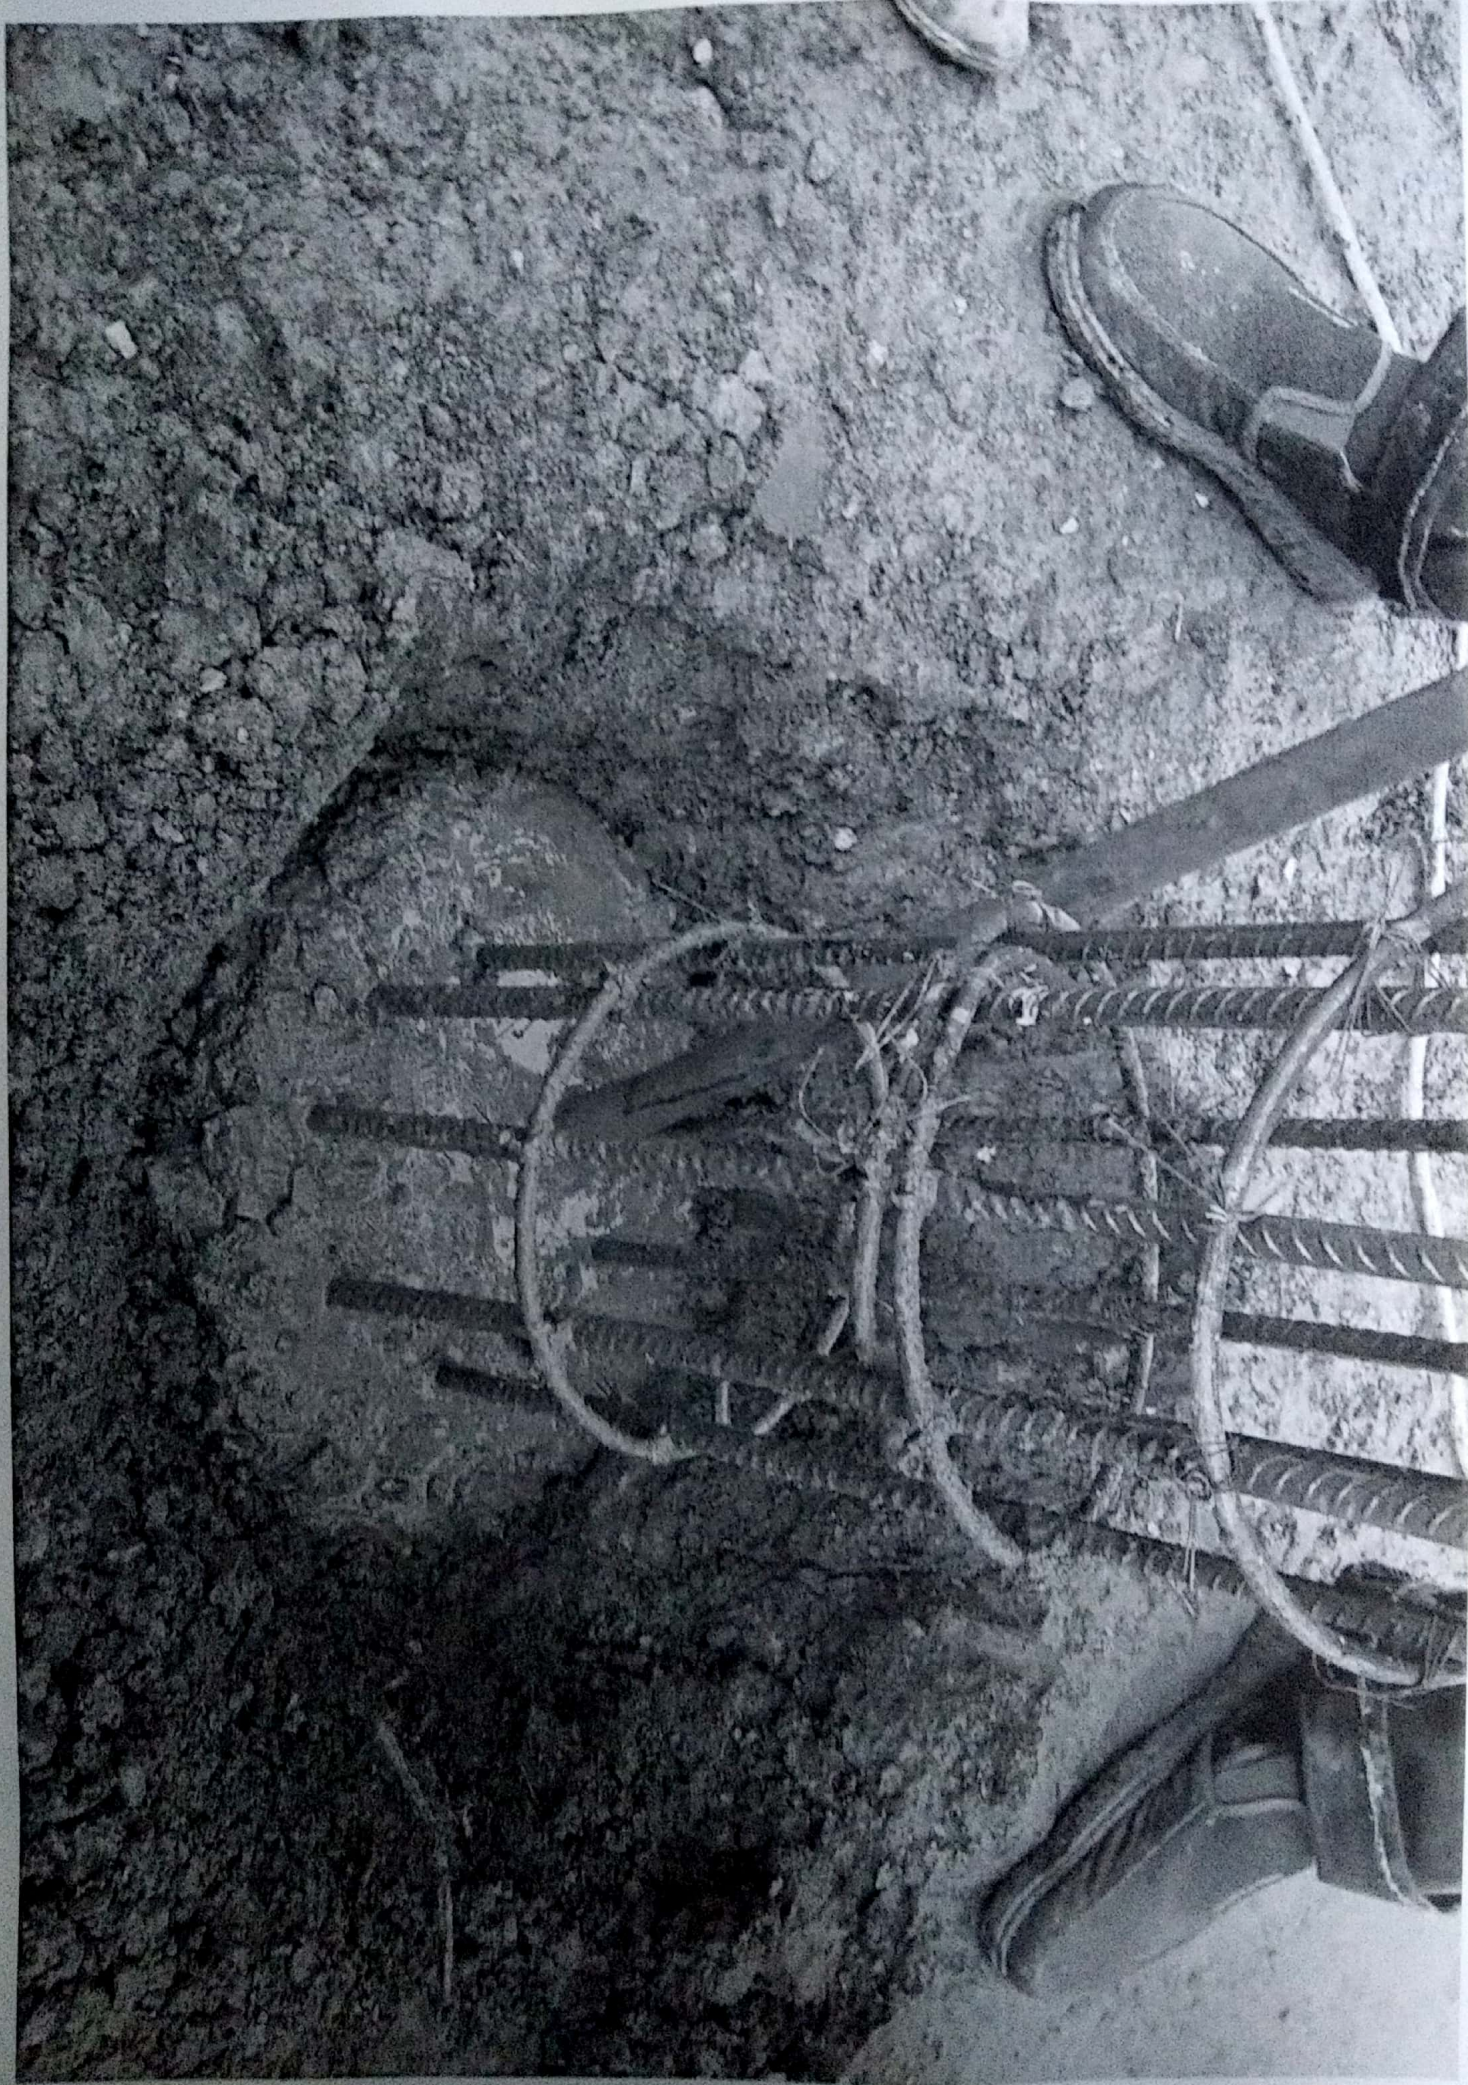

由 扫描全能王 扫描创建
