


旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（曲美1.971MW）

编号 GFDZJBM30-02

日期：2018 年 12 月 19 日 天气：晴	施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 12 月 19 日 10 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 12 月 19 日 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 8.3 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：周国海 梁松松 张远威 2018 年 12 月 19 日	



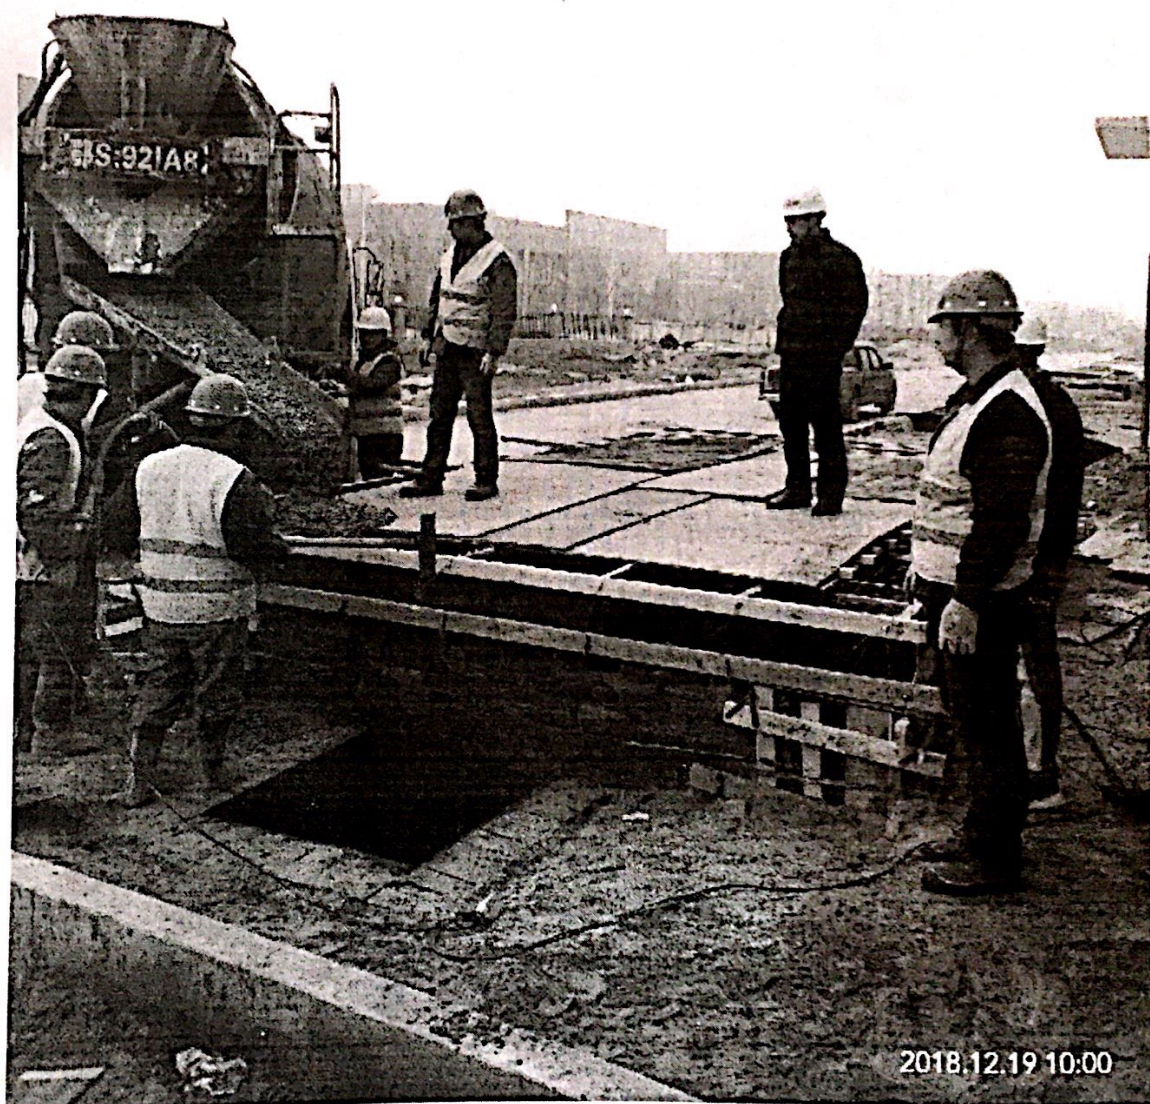

监理旁站

