


旁站监理记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM30-07

日期及气候: 12月19日	工程地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 箱逆变、一二次预制舱设备接地装置施工	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 接地体埋设深度符合设计规定, 当设计无规定时, 不宜小于 0.6m; 钢接地体的搭接采用搭接焊, 搭接长度和焊接方式满足规范要求(接地体(线)的焊接采用搭接焊, 其搭接长度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的两倍(且至少 3 个棱边焊接。)二、圆钢为其直径的 6 倍。三、圆钢与扁钢连接时, 其长度为圆钢直径的 6 倍)。为了连接可靠, 除在其接触部位两侧进行焊接外, 并焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。); 接地焊接结束后及时做好防腐处理, 钢材的切断面、镀锌钢材在焊接时镀锌层被破坏处也进行防腐处理;	
监理情况: 1、接地材料的型号、规格、镀锌处理等符合设计要求。 2、搭接长度: 扁钢为其宽度的 2 倍棱边施焊; 圆钢为其直径的 6 倍, 双面施焊; 圆钢与扁钢搭接时, 是圆钢直径 6 倍; 圆钢与扁钢、角钢、钢管搭接时, 为了连接可靠, 除接触部位两侧焊接外并焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由钢带本身弯成的弧形与钢管焊接。 3、接地装置安装敷设达到设计标准要求	
发现问题: 无	
处理意见:	
施工项目部: 湖南鸿源电力建设有限公司 质 检 员: 李岩 日 期: 2018 年 12 月 19 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 周国友 日 期: 2018 年 12 月 19 日



扫描全能王 创建

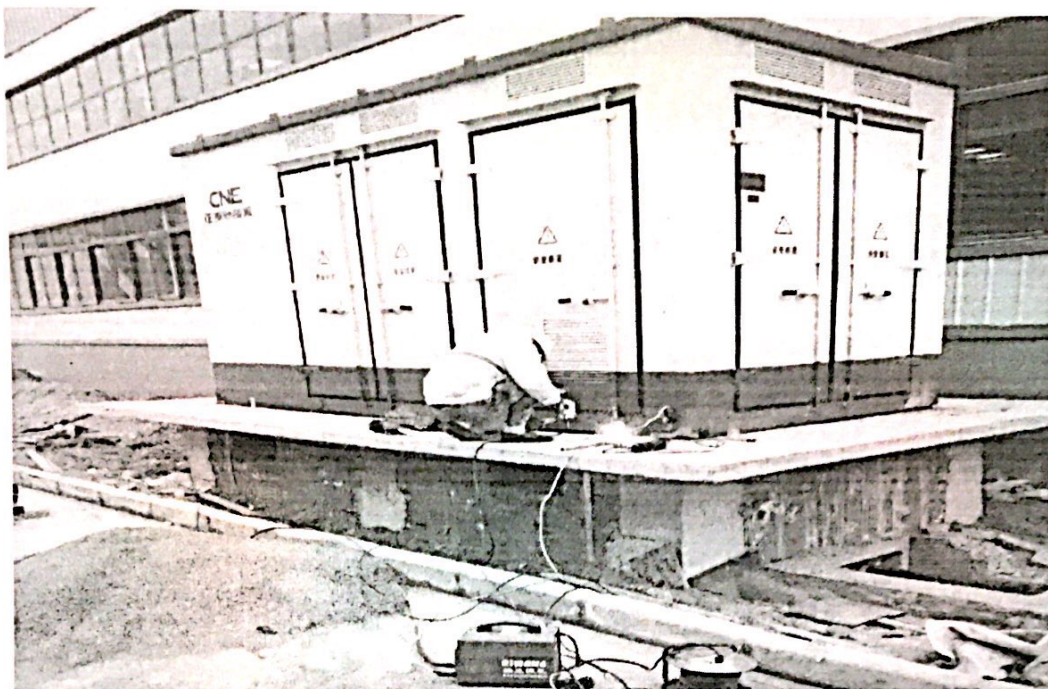

箱逆变设备接地焊接 (01)



箱逆变设备接地焊接 (02)

