

## 旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003


日期及气候：2018.10.19 阴转小雨 | 工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩

旁站监理的部位或工序：东南区微孔桩浇筑

旁站监理开始时间：14:00 | 旁站监理结束时间：16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行浇筑交底，然后开始工作。人员将砂石水倒入搅拌机而后将混凝土倾泻，工人将混凝土抬至微孔桩处然后注入微孔，之后工人将混凝土在微孔中均匀振捣。

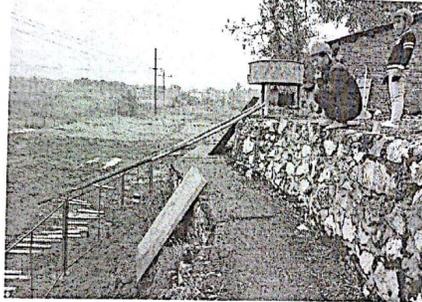

监理情况：

现场监理人员要求施工人员做好安全防护，检查微孔浇筑后是否对齐找平，另外在灌浆时要求施工单位对其用振动棒搅拌，微孔桩歪斜的要求施工方进行校正。

发现的问题及处理情况：

个别微孔浇筑面不平整未对齐，已要求施工方后期对有坑洼面进行找平。

旁站监理人员（签字）：任志云 张煊

2018年10月19日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
